

DOSSIER D'EXPLOITATION
PONTS DE CÉ – Giratoire des Portes de Cé



INTERVENANTS


TRAVAUX D'EAUX USÉES ET D'EAU POTABLE

MAITRES D'OUVRAGE	
MAITRES D'ŒUVRE	
ENTREPRISES	

NATURE ET LOCALISATION DES TRAVAUX

Réhabilitation des réseaux EU & AEP

- Réseau EU projet
- Conduite d'eau potable Ø200 projet
- Conduite d'eau potable Ø500 projet
- Conduite d'eau potable Ø600 projet
- Conduite d'eau potable Ø400 projet

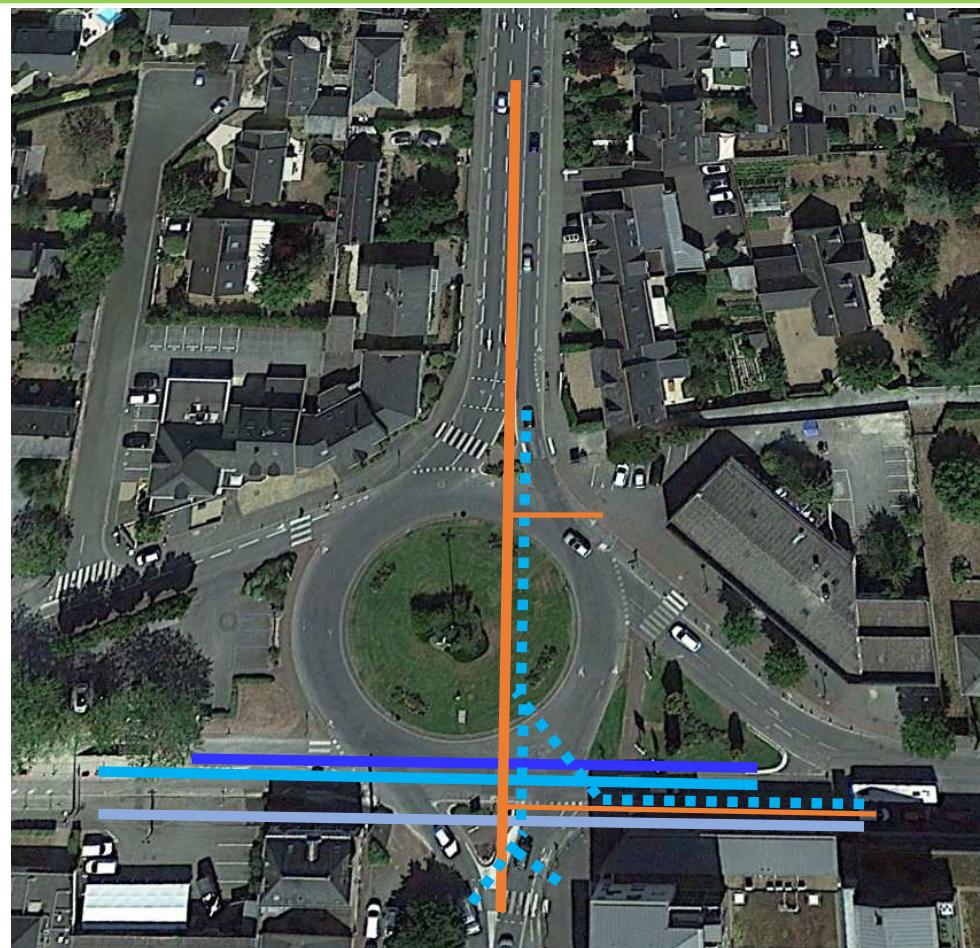

Réhabilitation de réseaux EU & AEP

PONTS DE CÉ – Giratoire des Portes de Cé – Rue Edouard Rohard



PLANNING TRAVAUX

POSE DU RESEAU D'EAUX USEES


1-déc-23

POSE DES RESEAUX D'EAU POTABLE


PHASAGE DES TRAVAUX



PHASE 2.2 : Pose EU Ø400 + AEP Ø200
Du 07/12 au 18/12

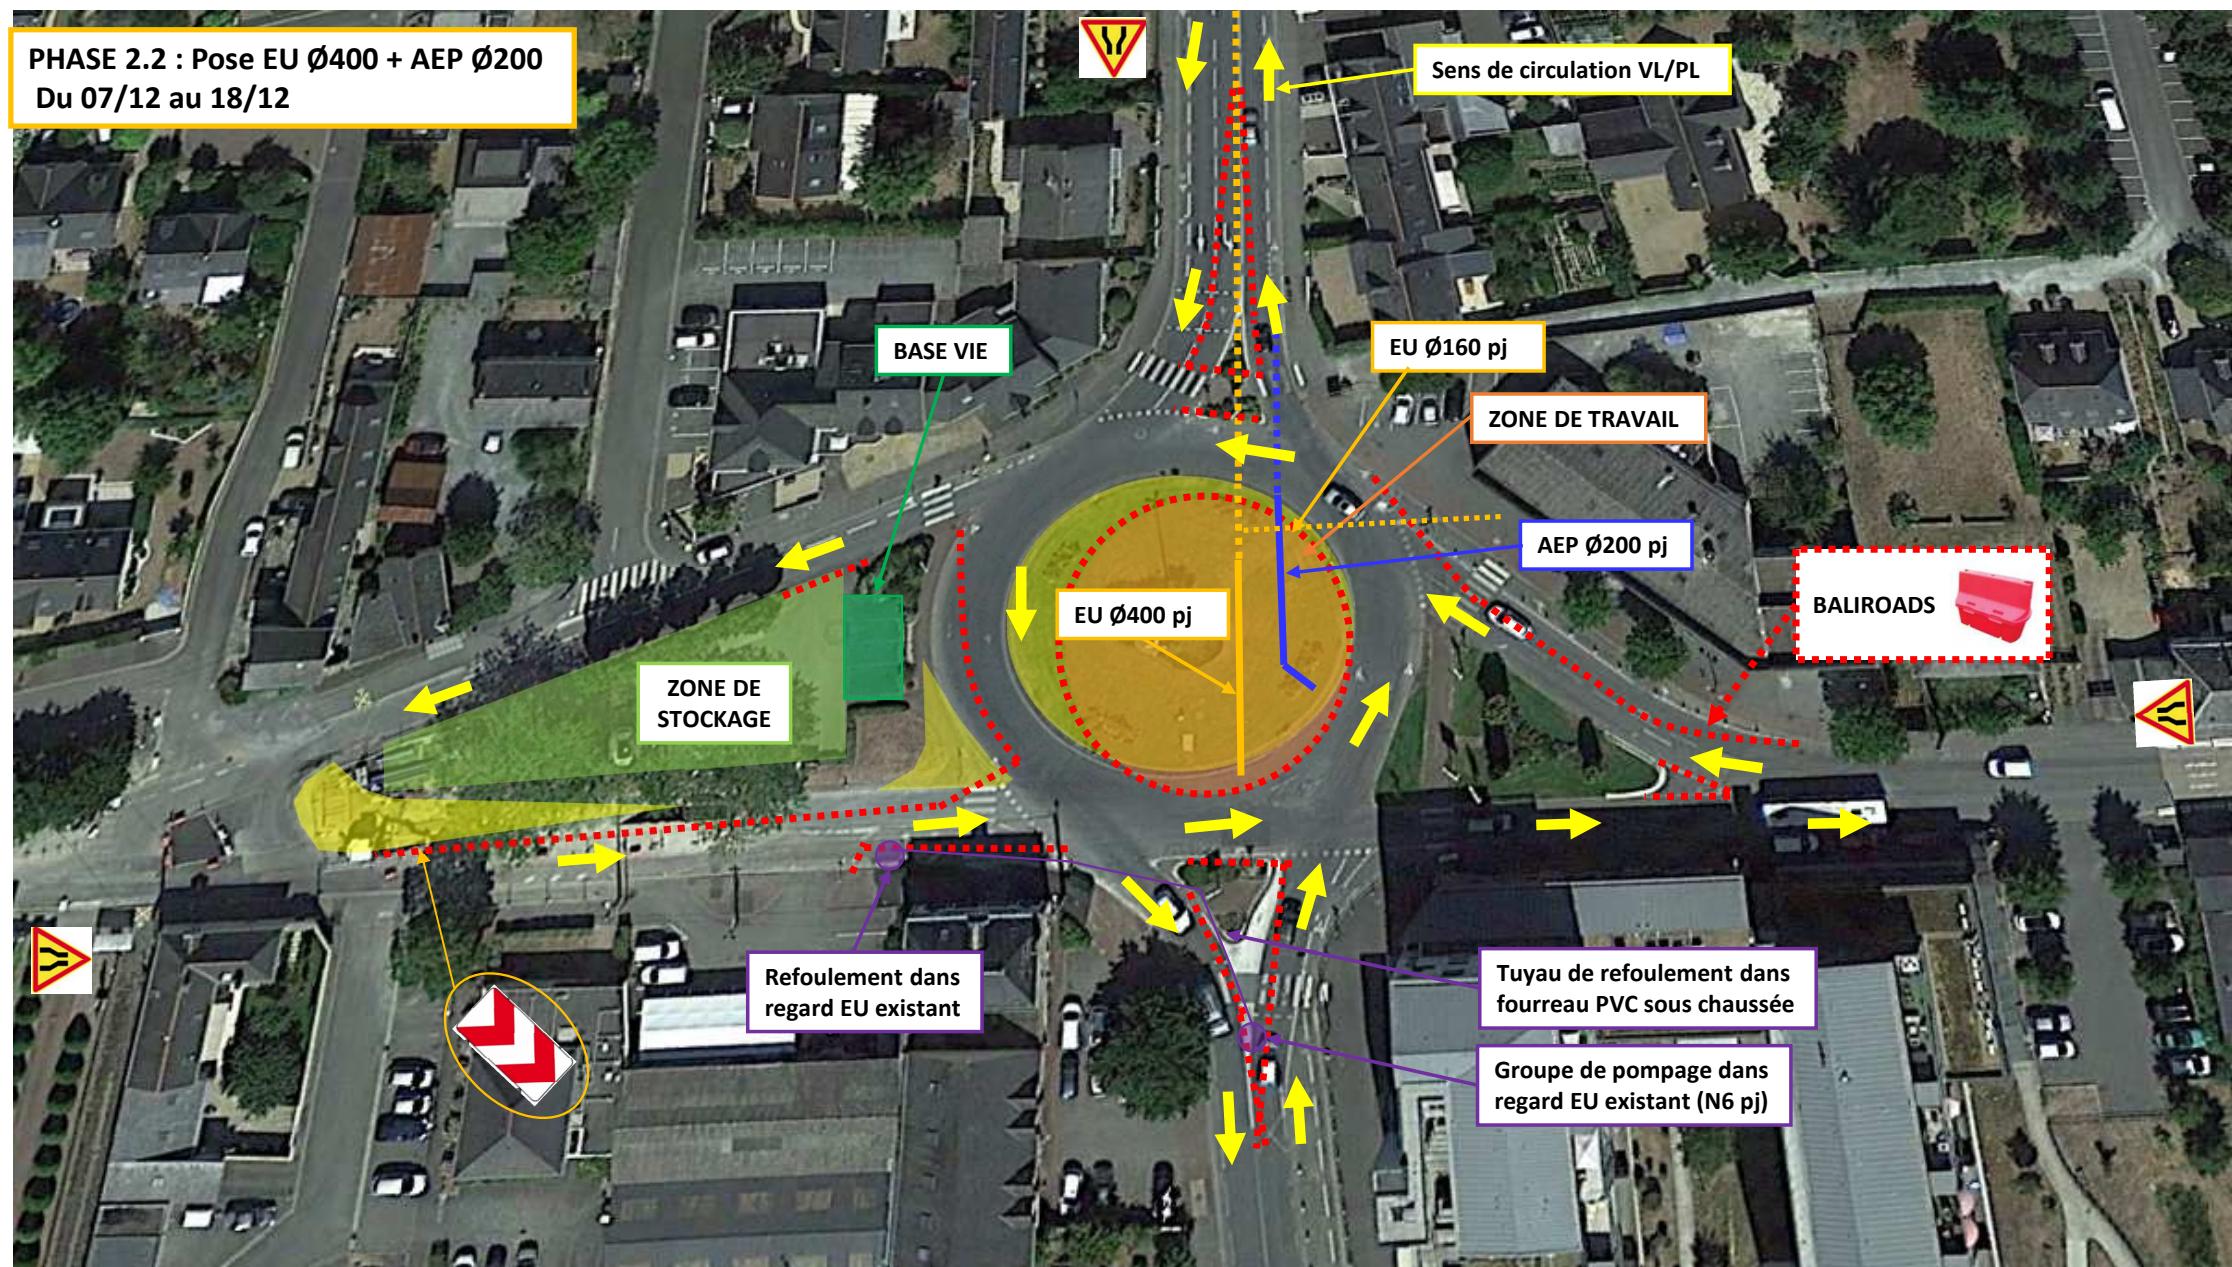

PHASE 2.3 : Libération d'emprise rue David d'Angers
Du 19/12 au 22/12

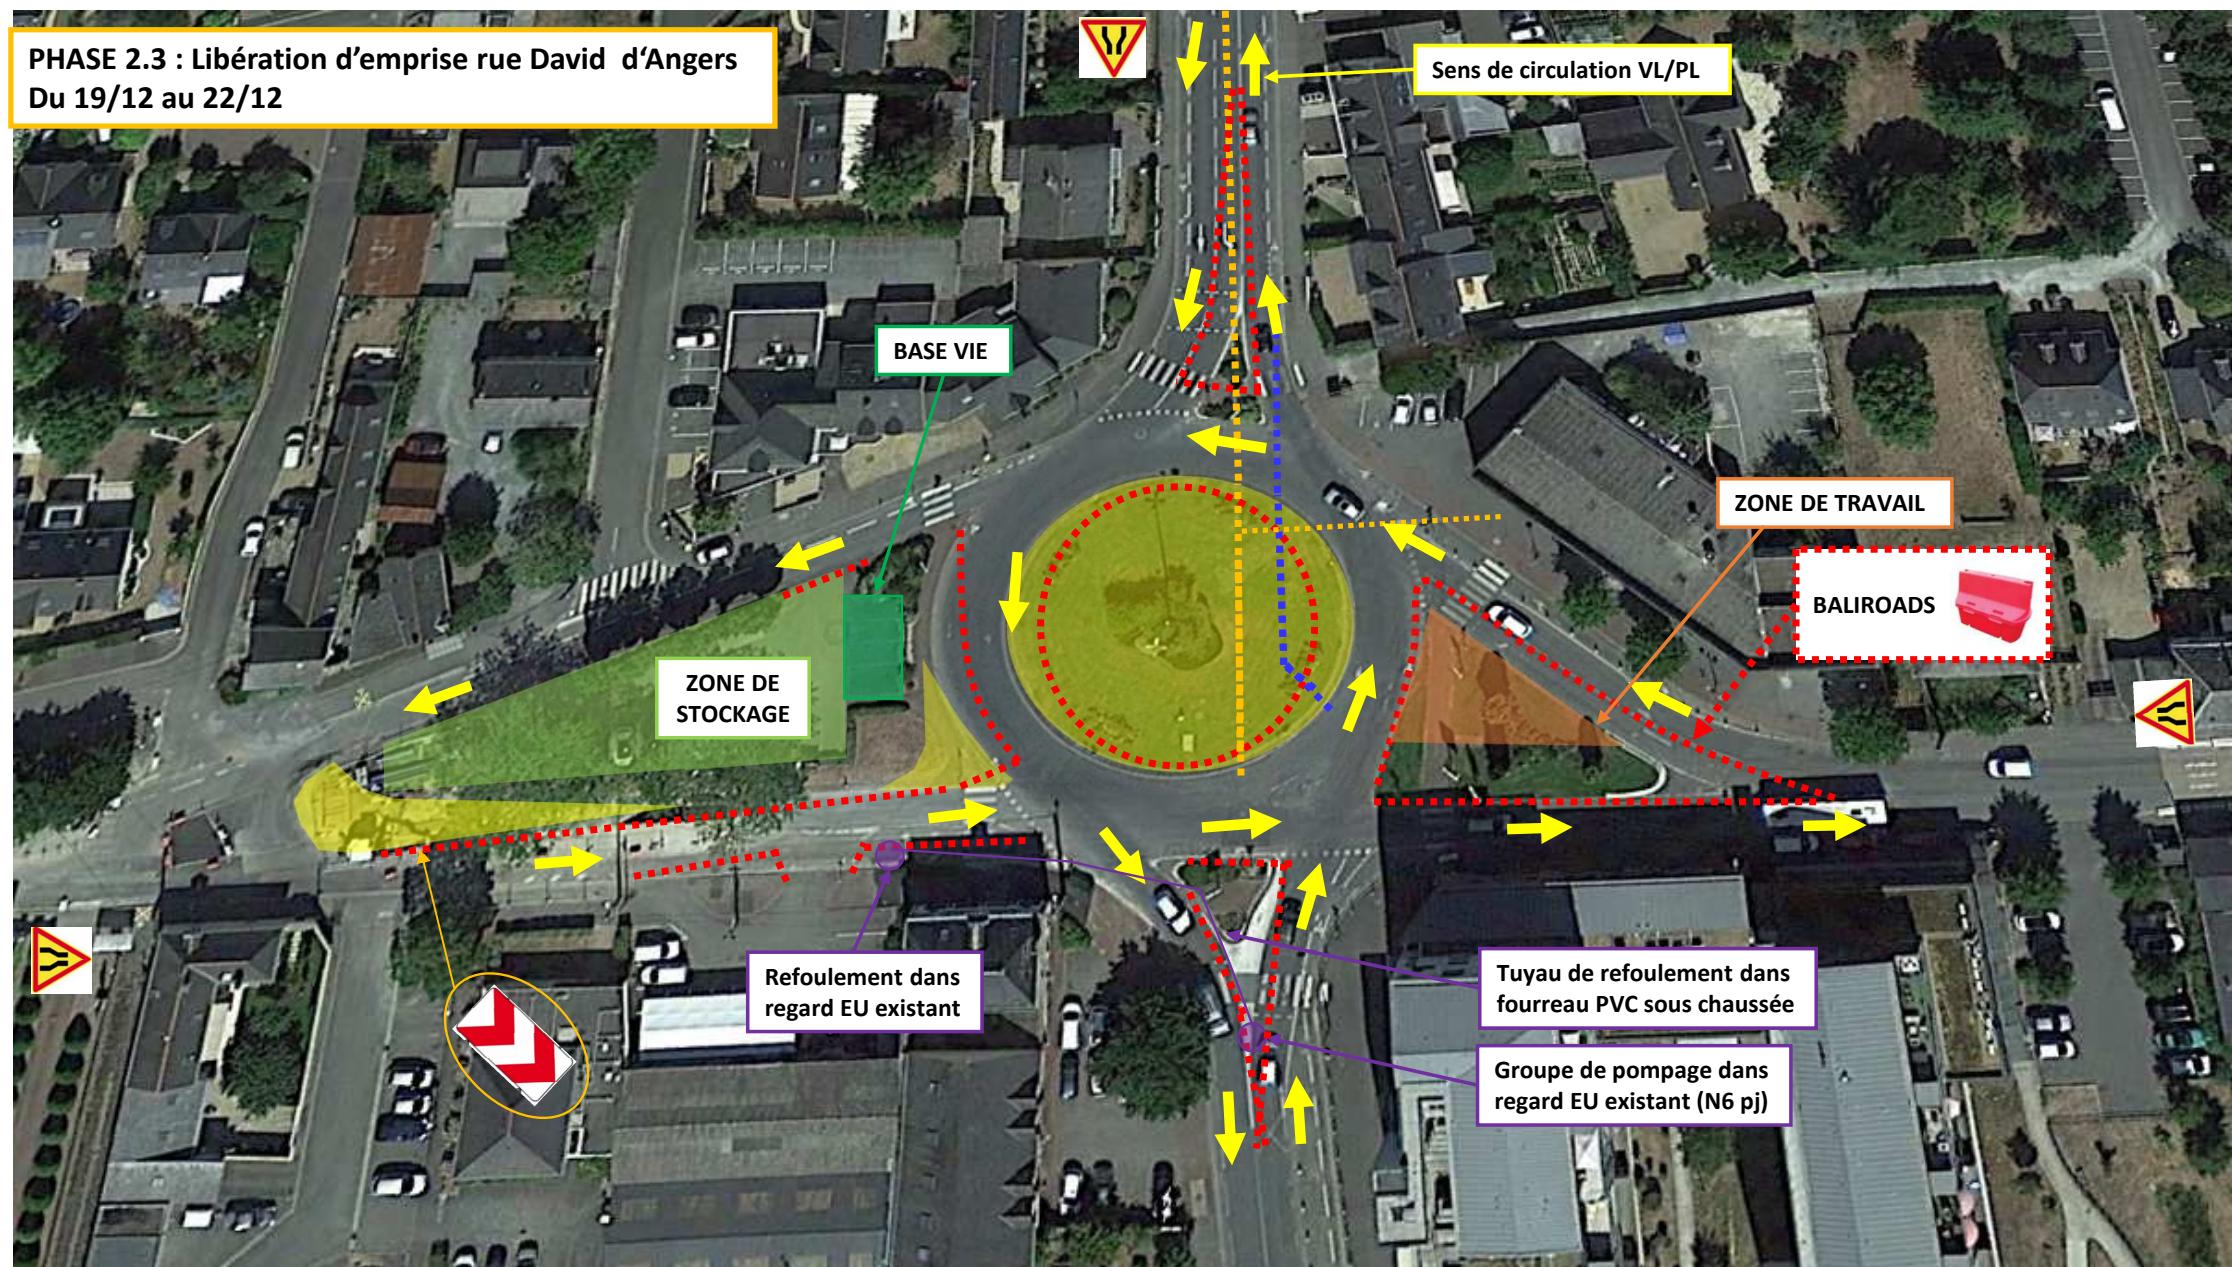


PHASE 2.4 : SCHEMA DEVIATION


Travaux Giratoire des Portes de Cé / Rue David d'Angers
à partir du 09/01/24 au 12/06/24

1
ROUTE
BARRÉE
À...00 m


2
ROUTE
BARRÉE

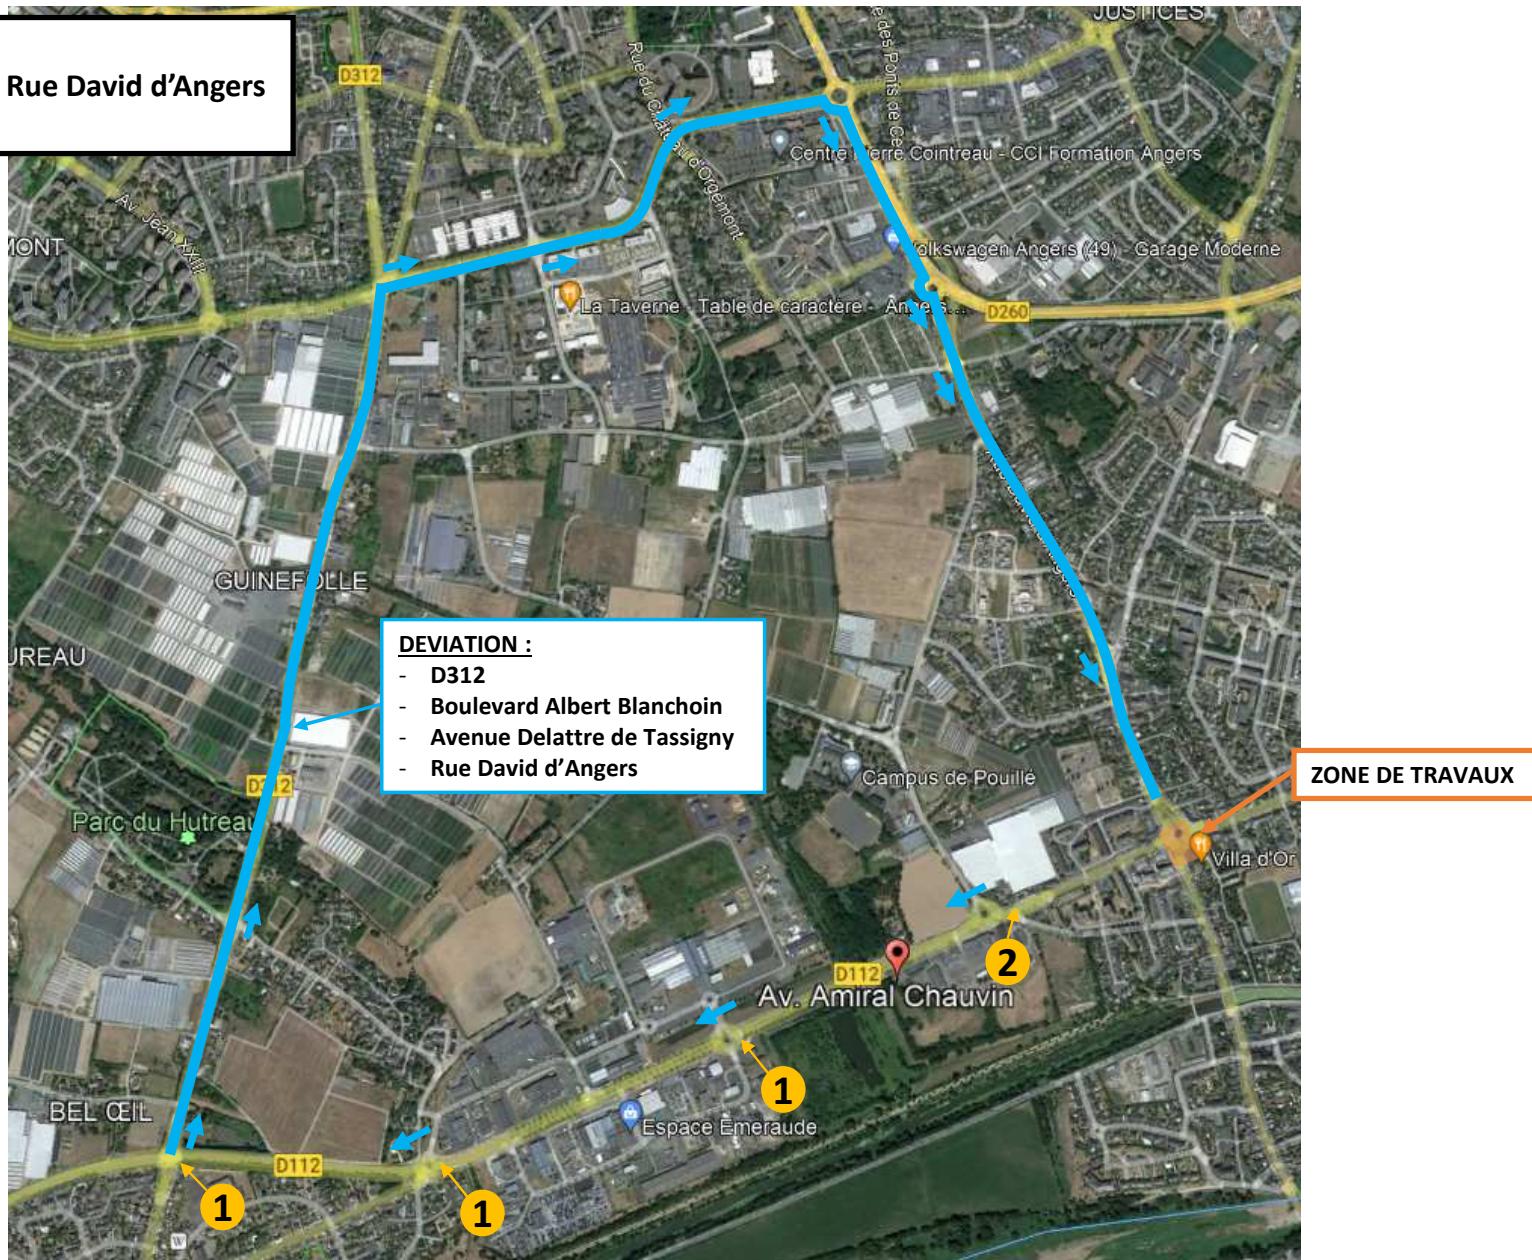


PHASE 2.4 : Pose EU Ø400 + regard EU N7 + Ø200
Du 09/01 au 31/01/24

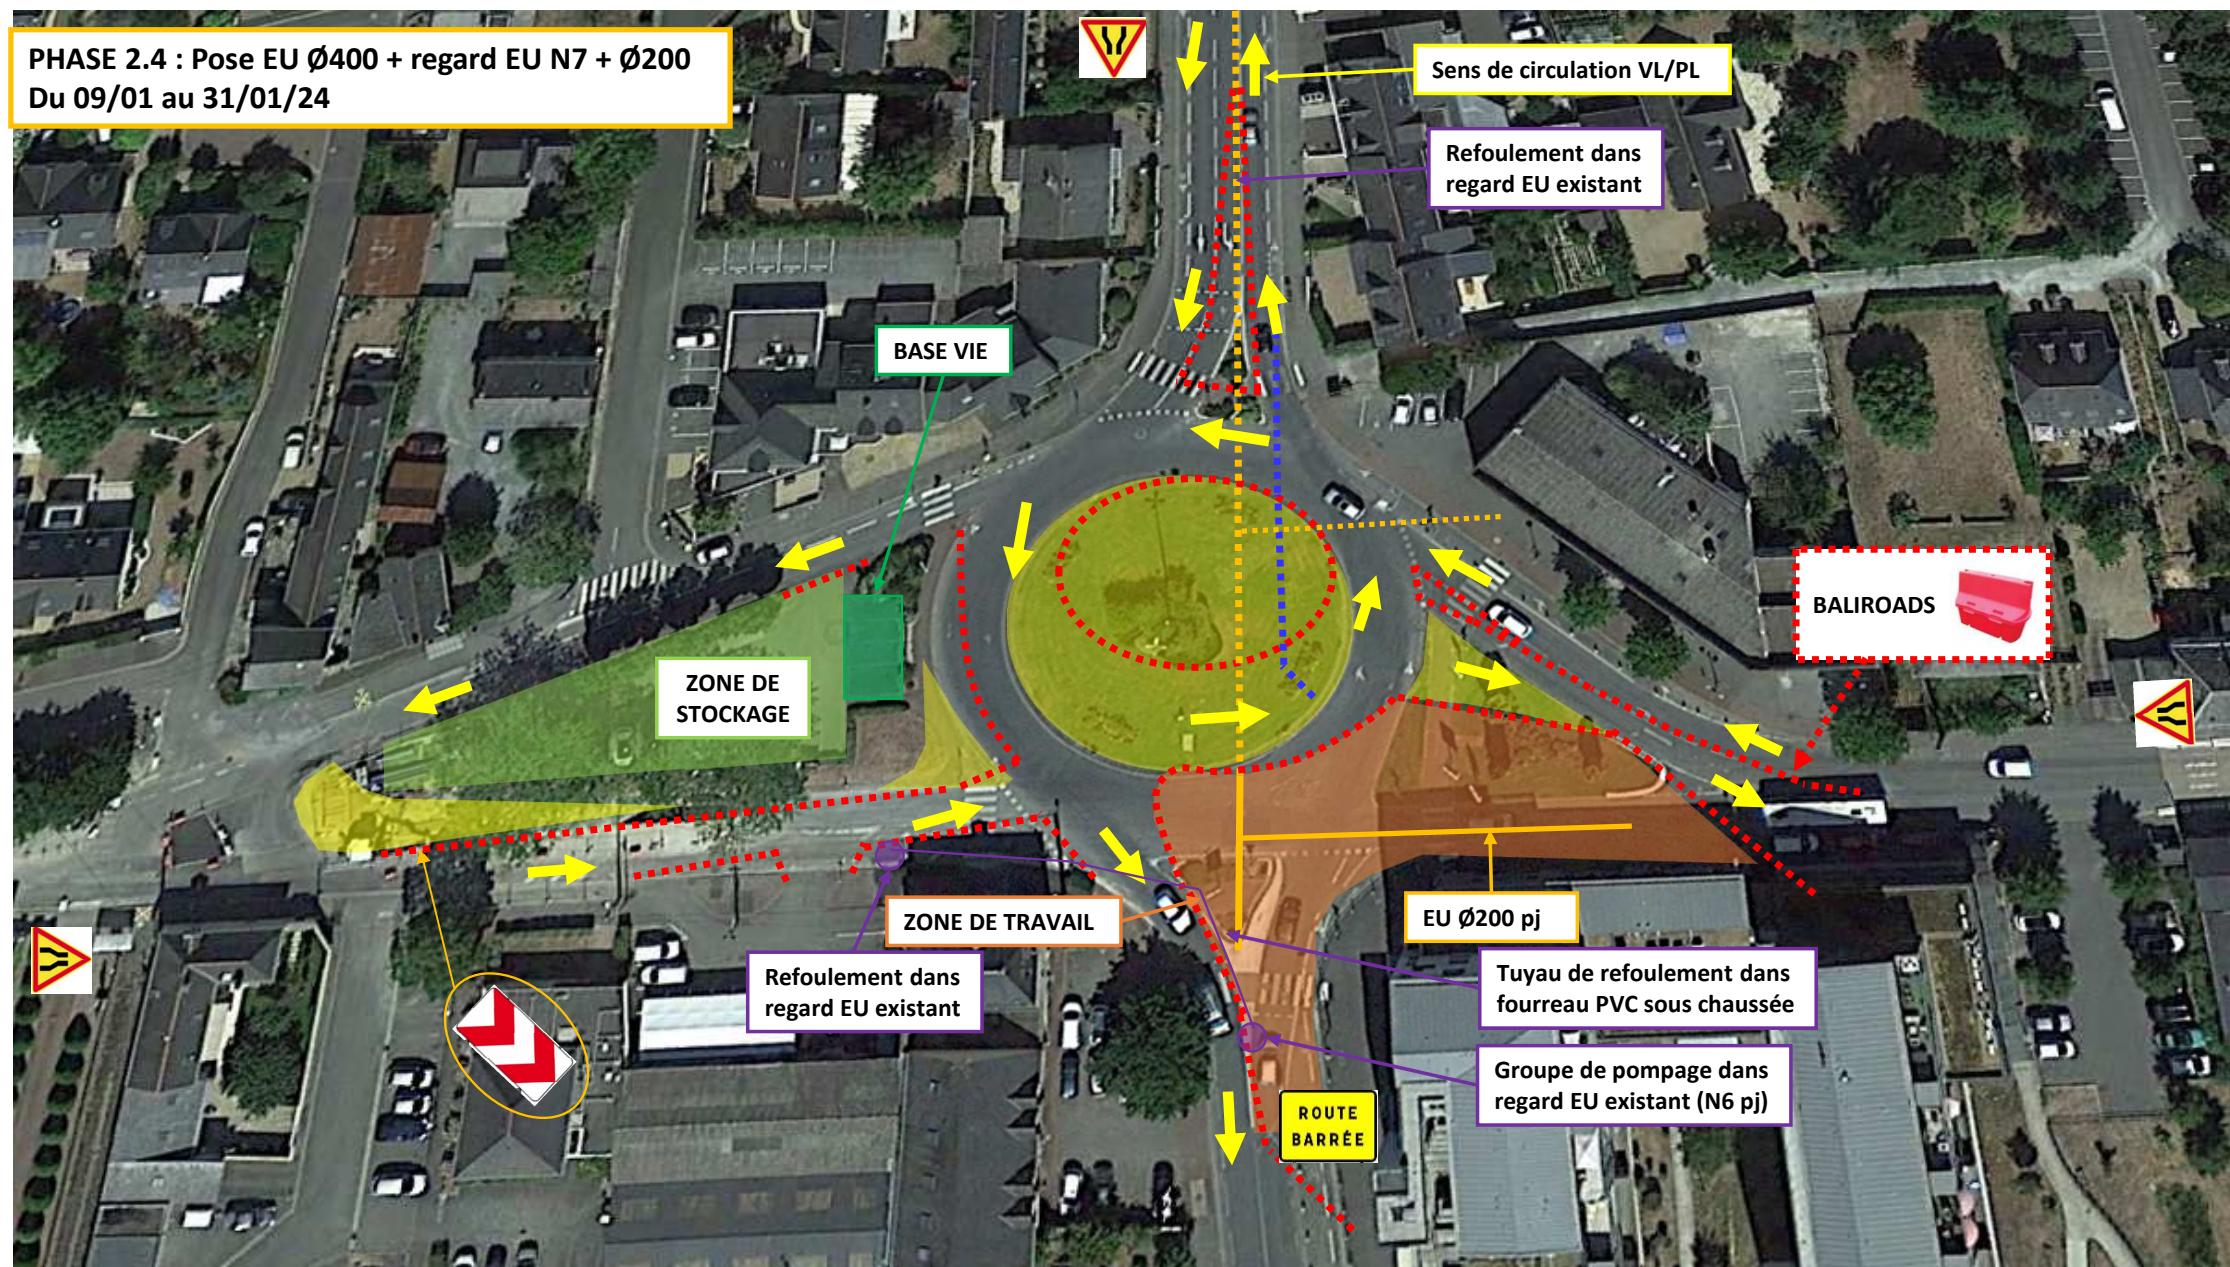

PHASE 3.1 : Pose AEP Ø400
Du 01/02/24 au 09/02/24

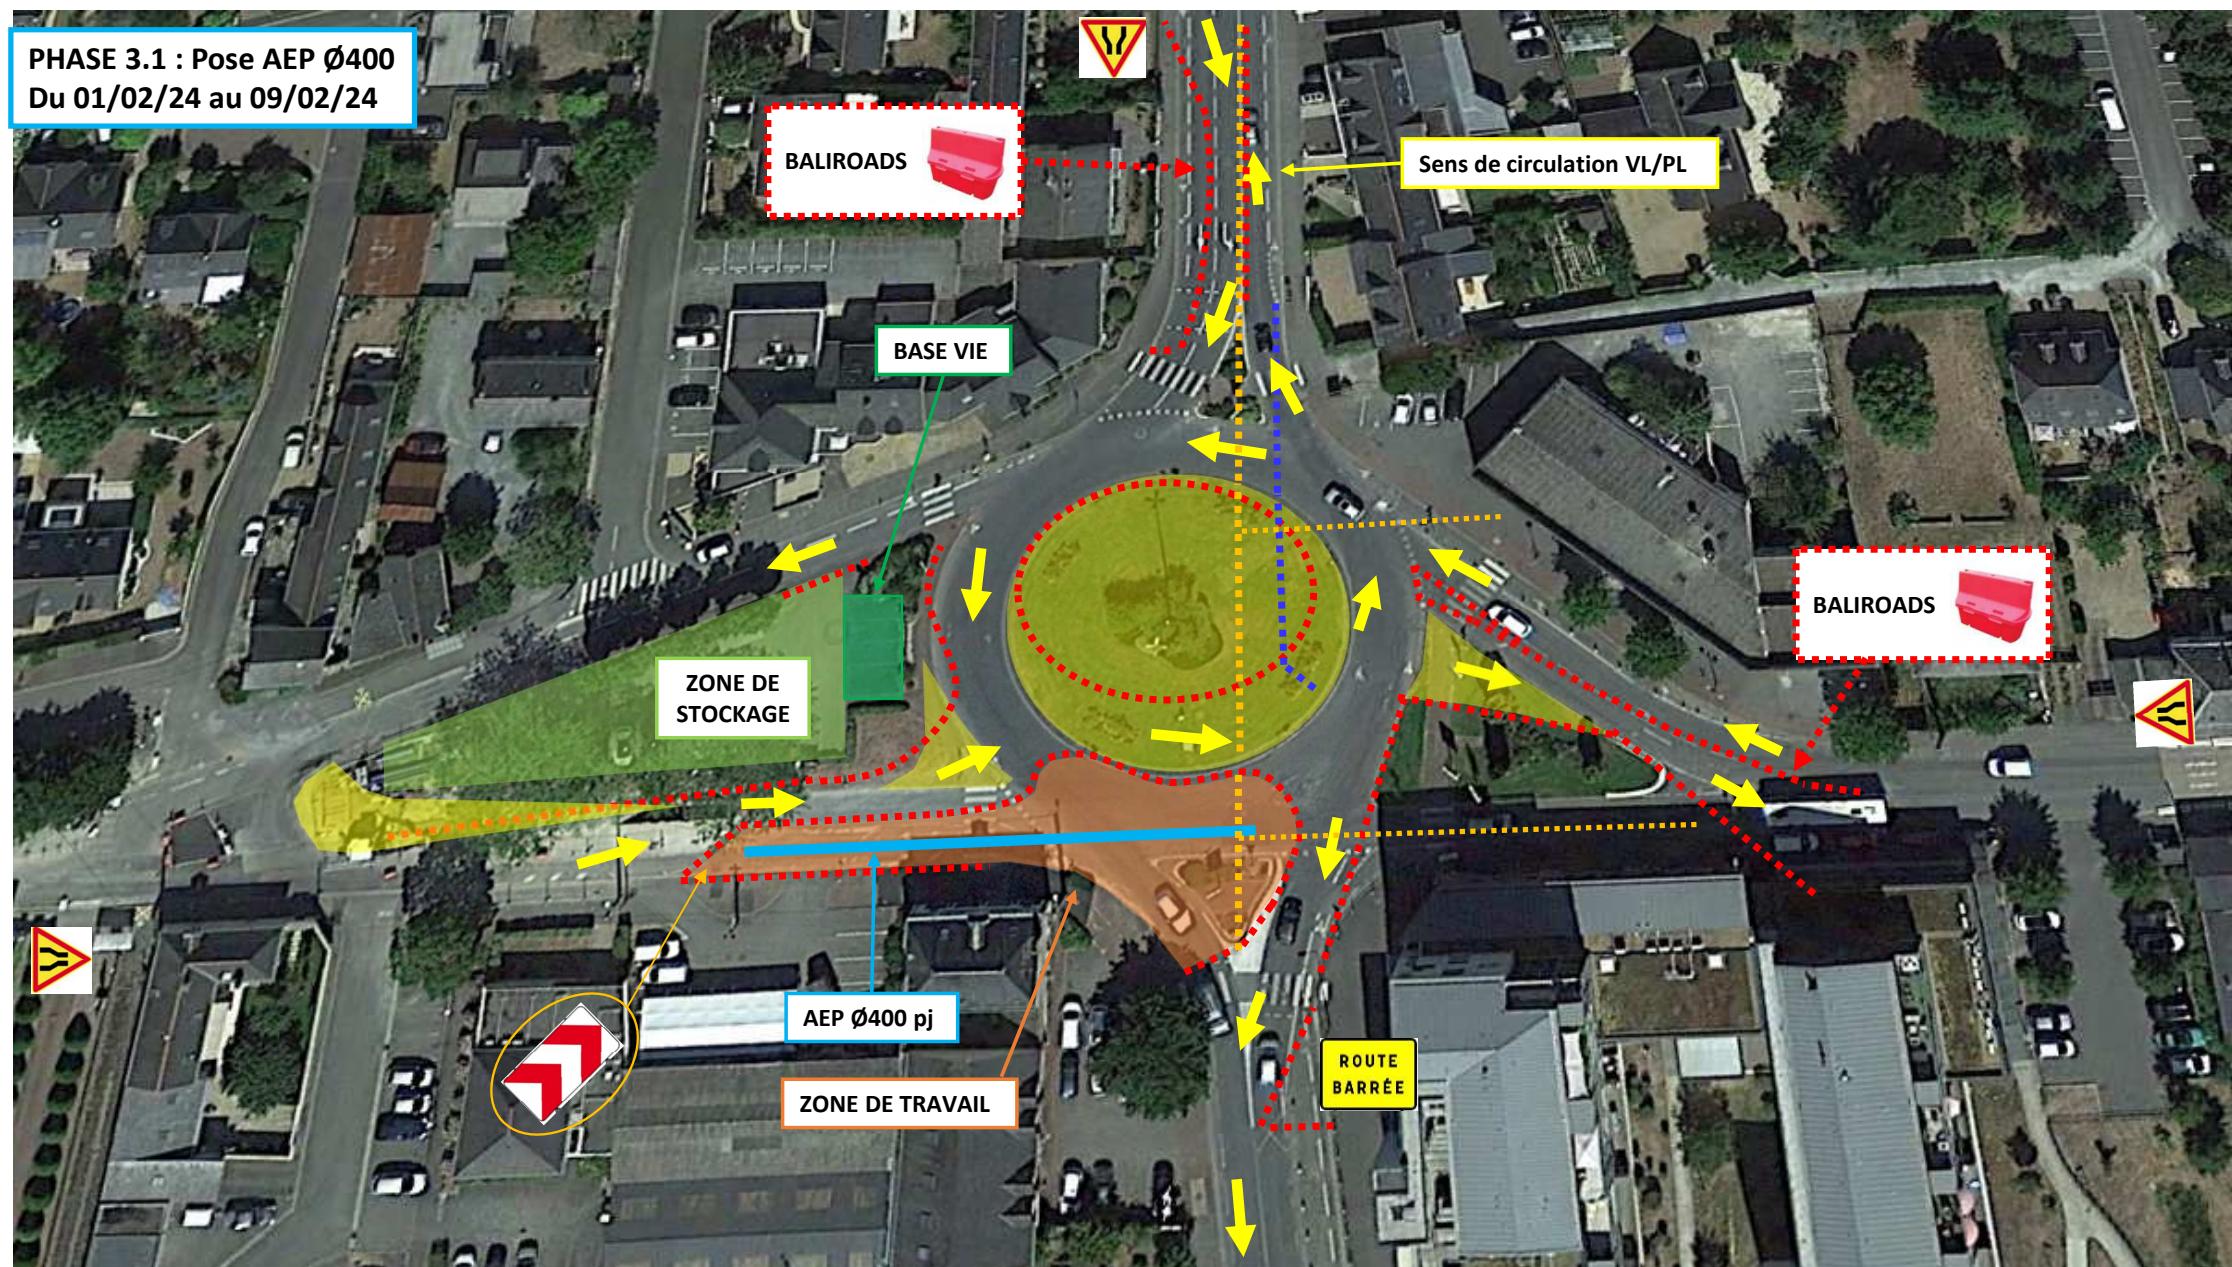


PHASE 3.2 : Pose AEP Ø400
Du 12/02/24 au 15/02/24

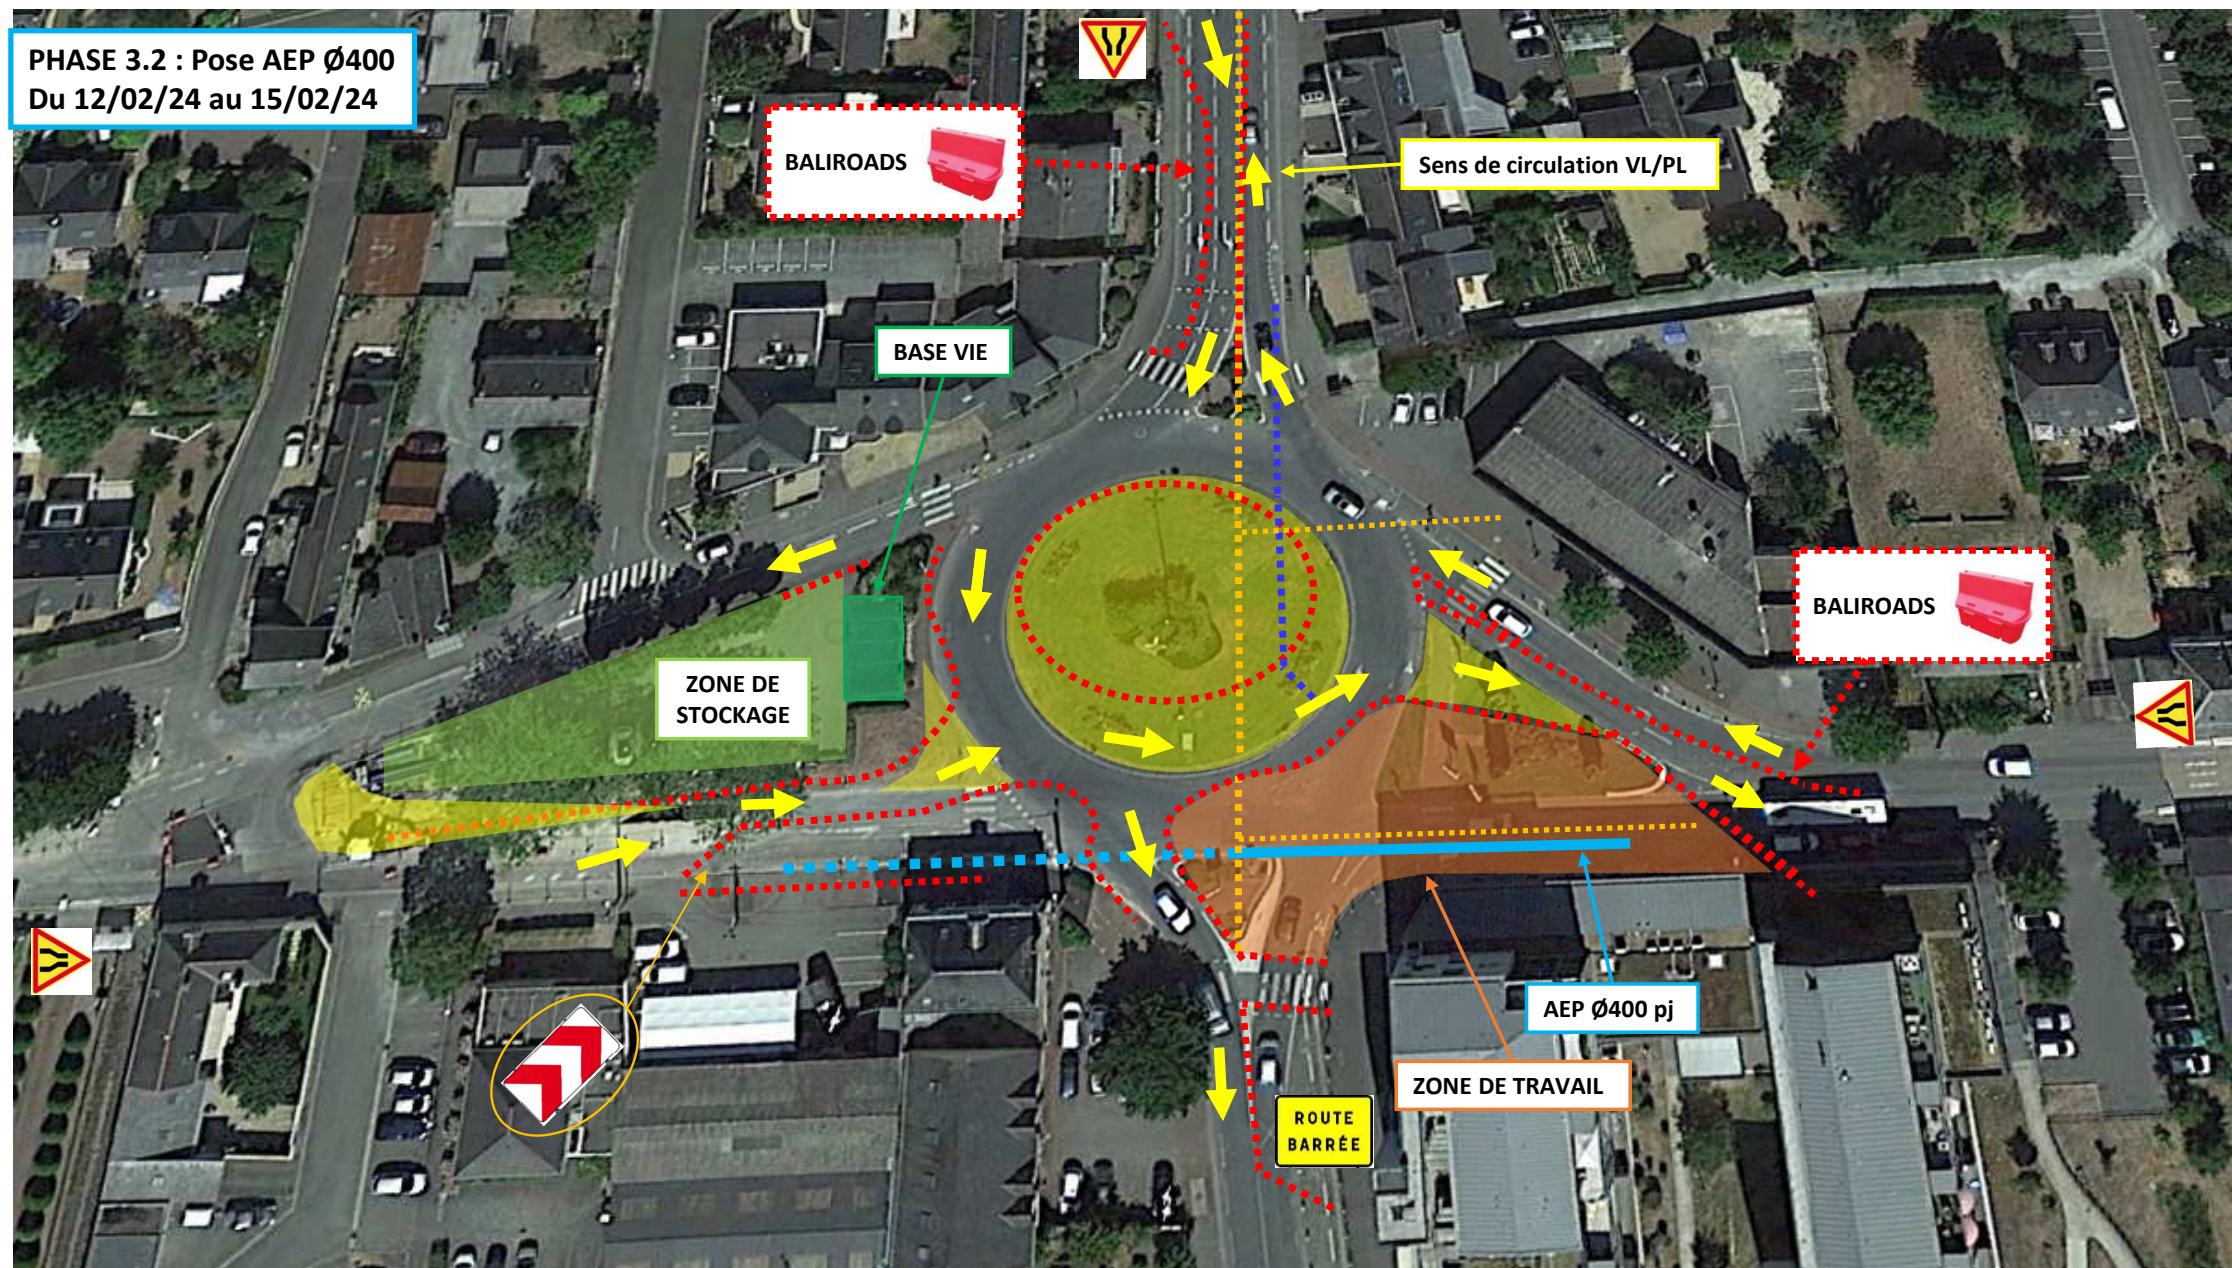


PHASE 3.3 : Essais / Raccordements AEP Ø400

Du 16/02/24 au 01/03/24

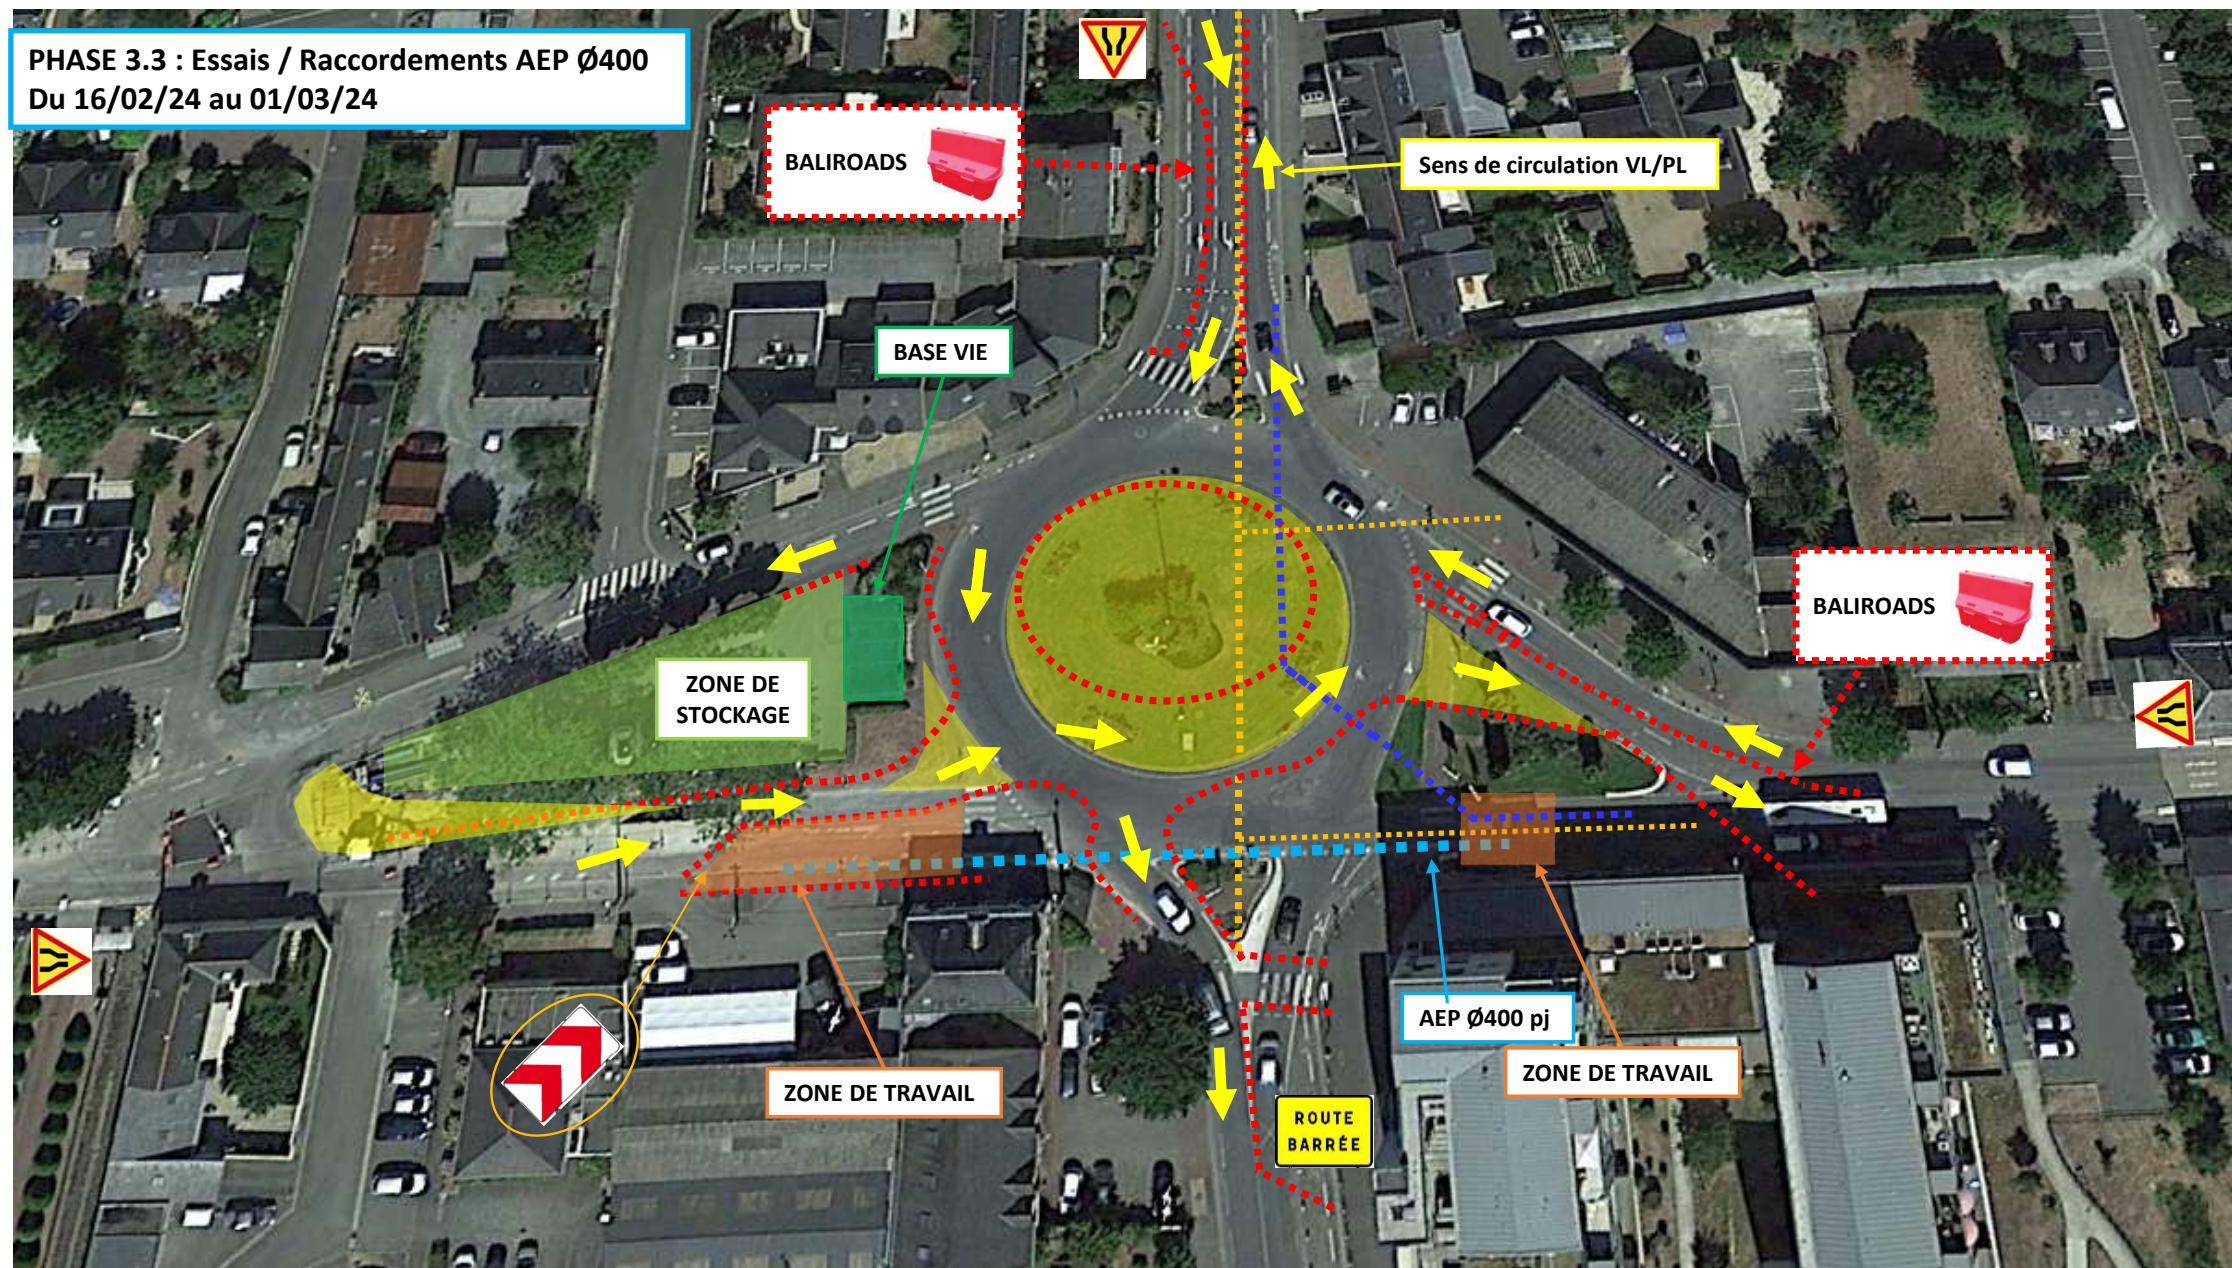


PHASE 4.1 : Pose AEP Ø600
Du 04/03/24 au 12/03/24

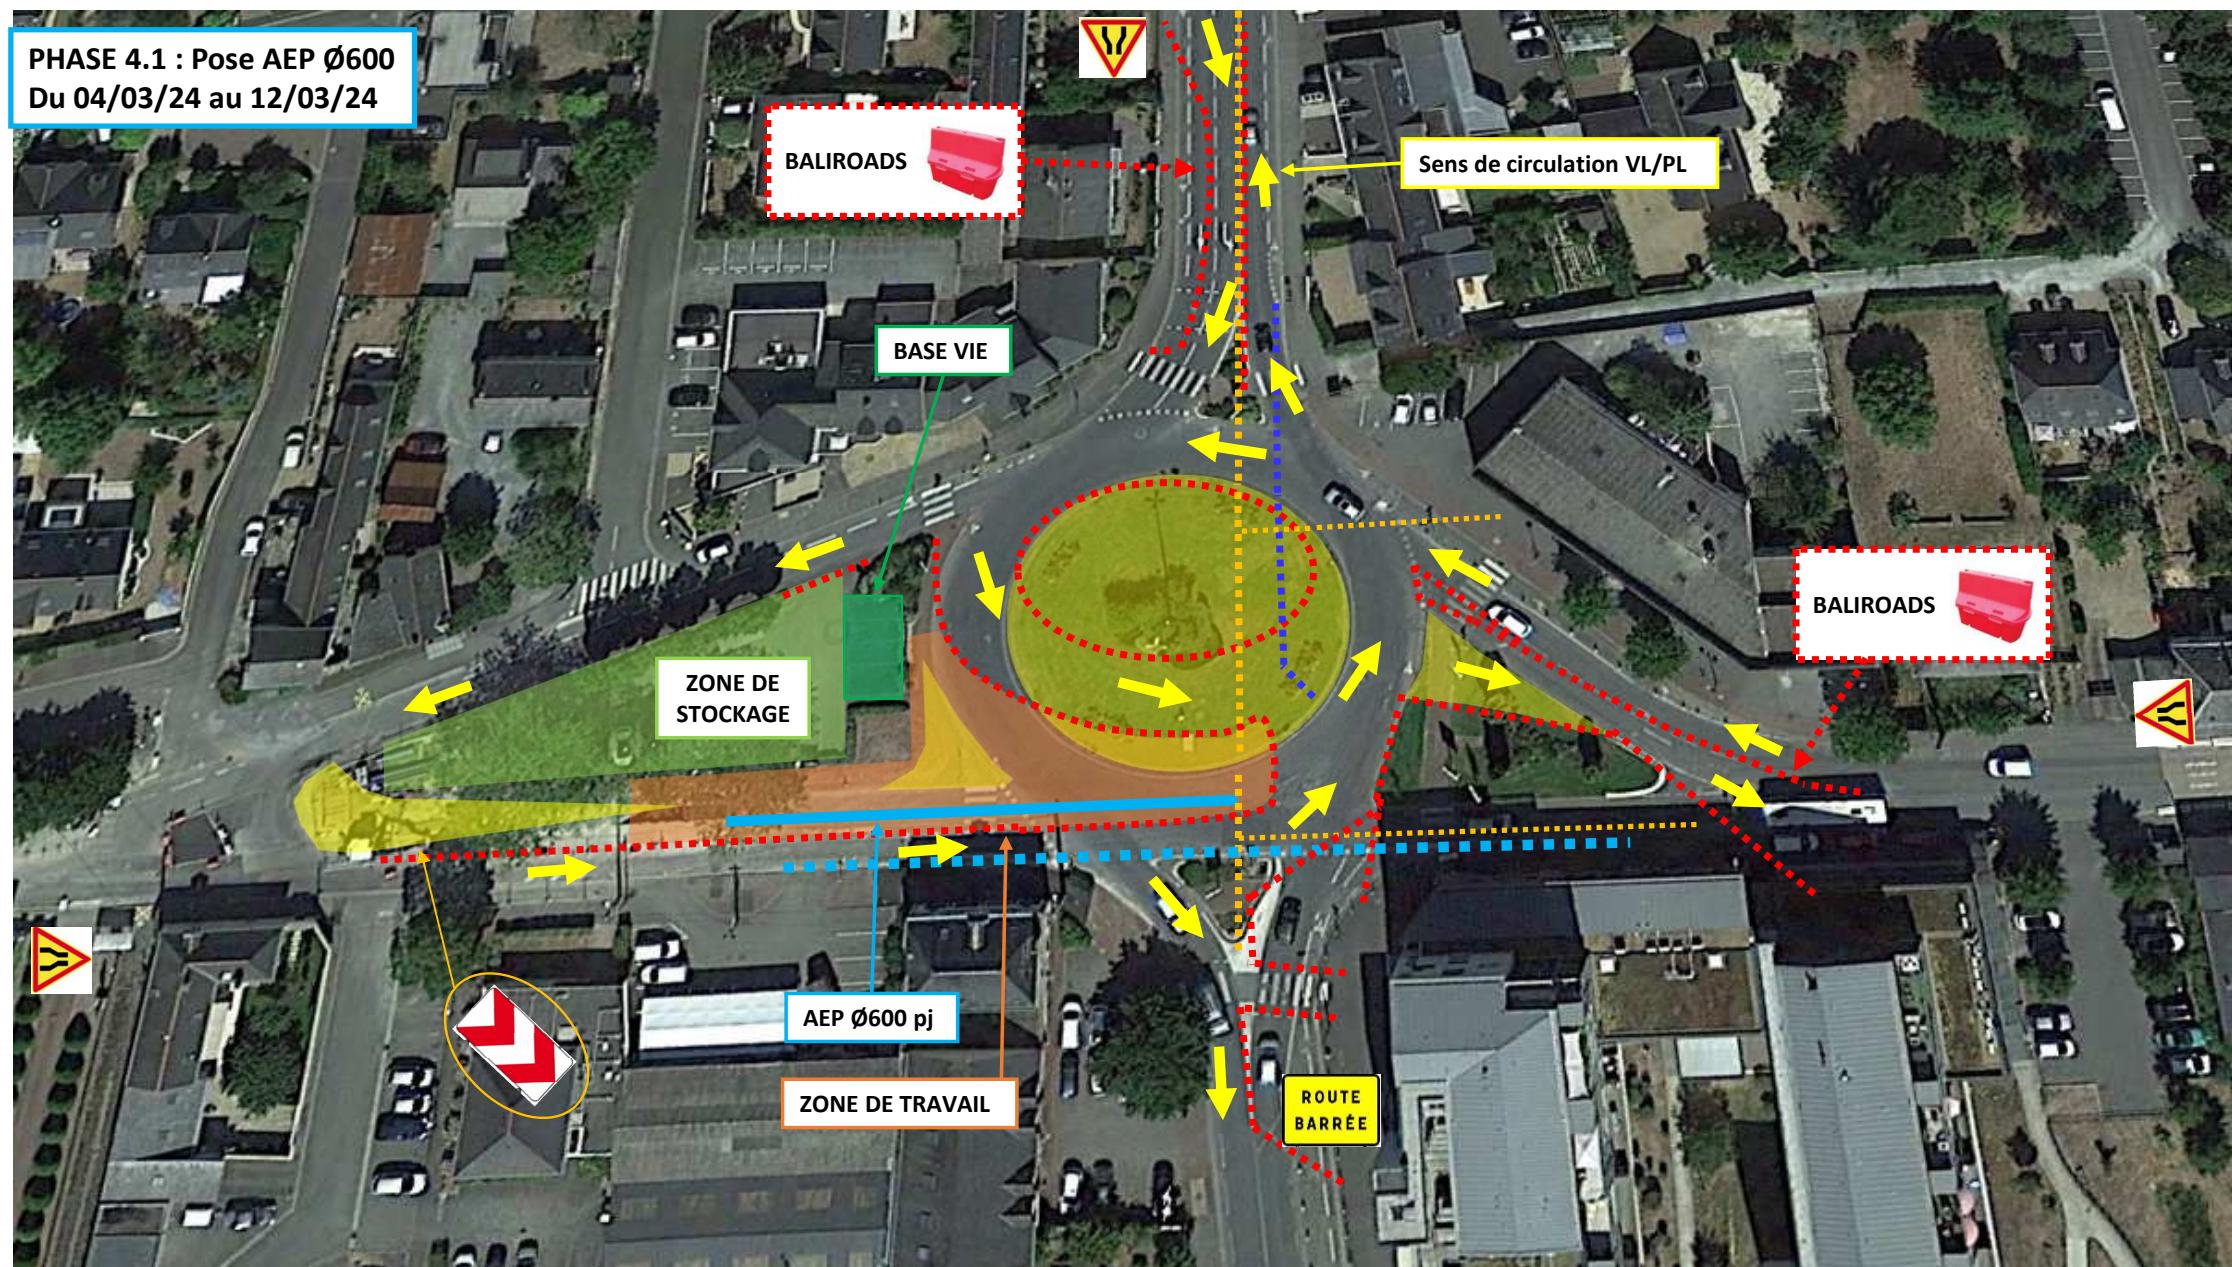


PHASE 4.2 : Pose AEP Ø600 & AEP Ø300

Du 13/03/24 au 18/03/24

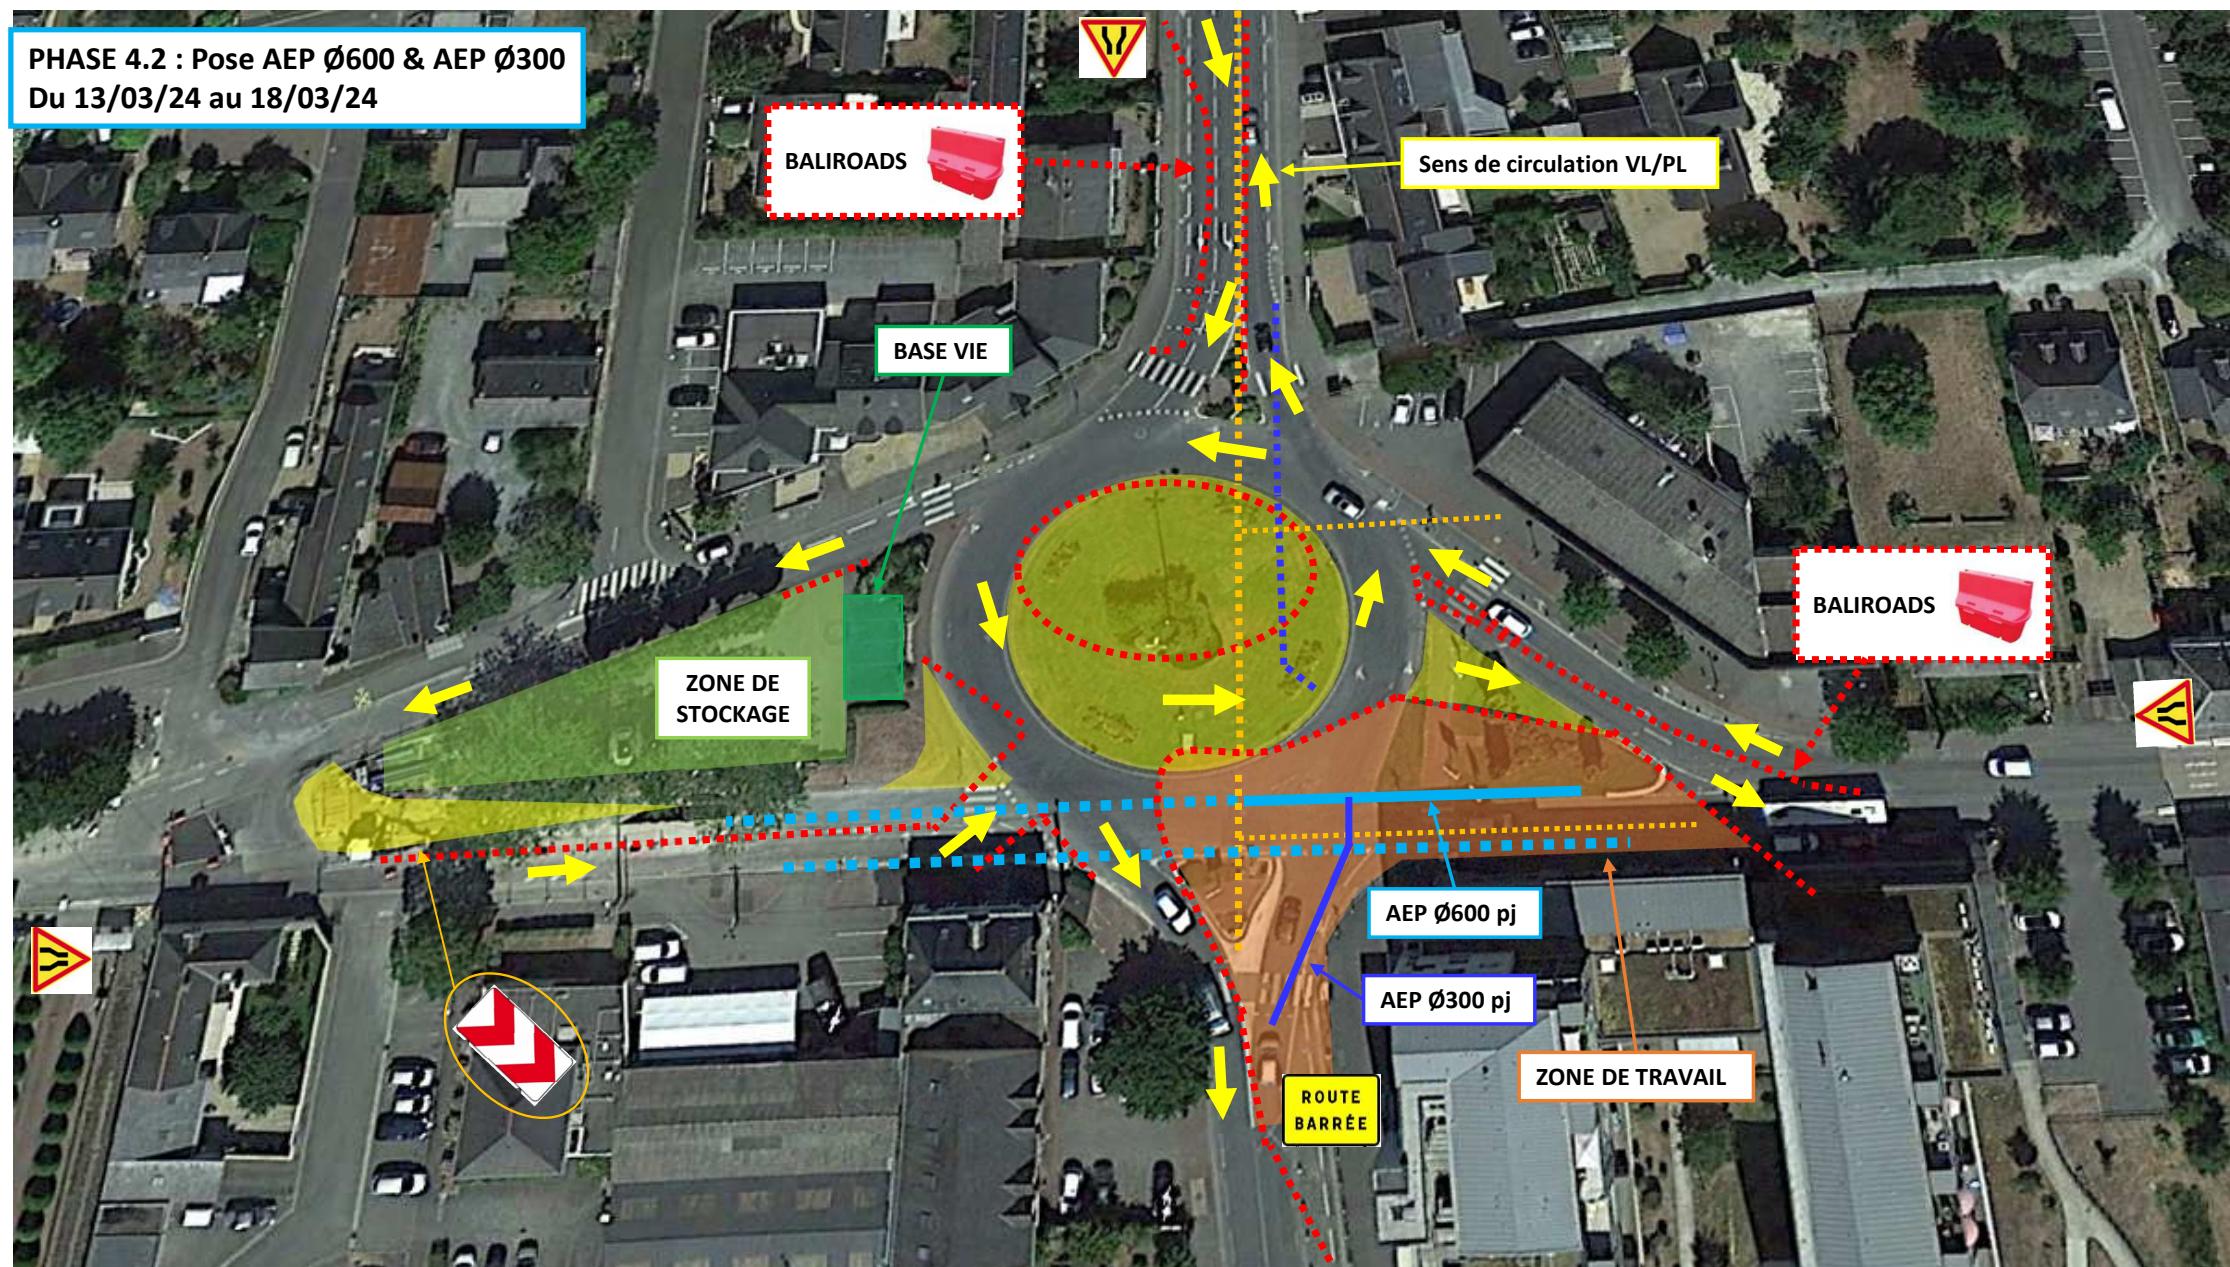


PHASE 4.3 : Essais raccordements AEP Ø600

Du 19/03/24 au 08/04/24

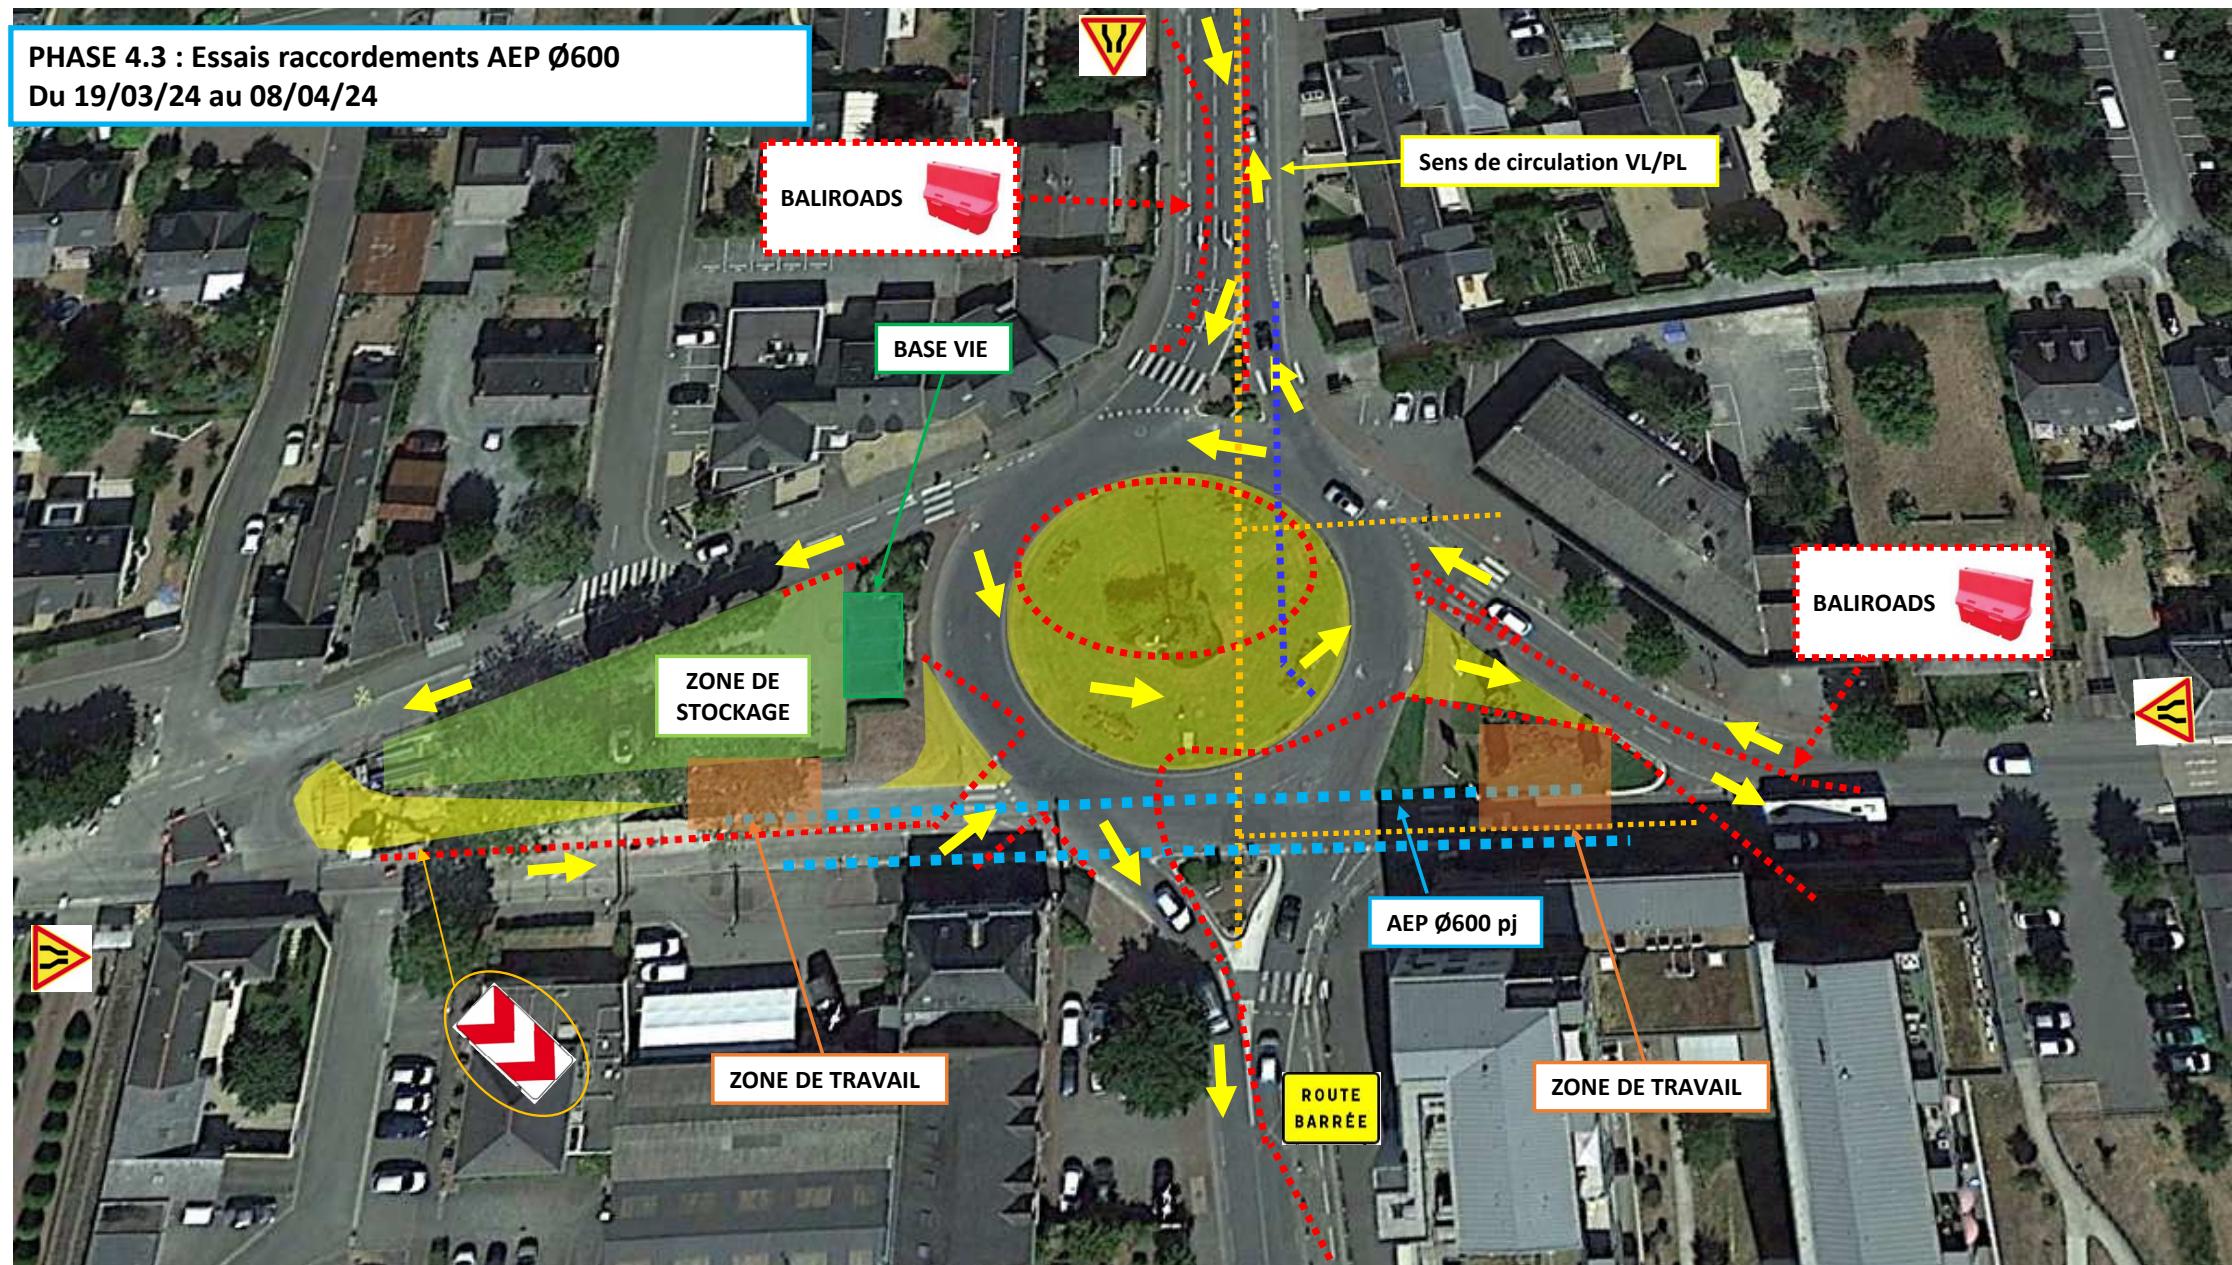


PHASE 5.1 : Pose AEP Ø500

Du 09/04/24 au 16/04/24

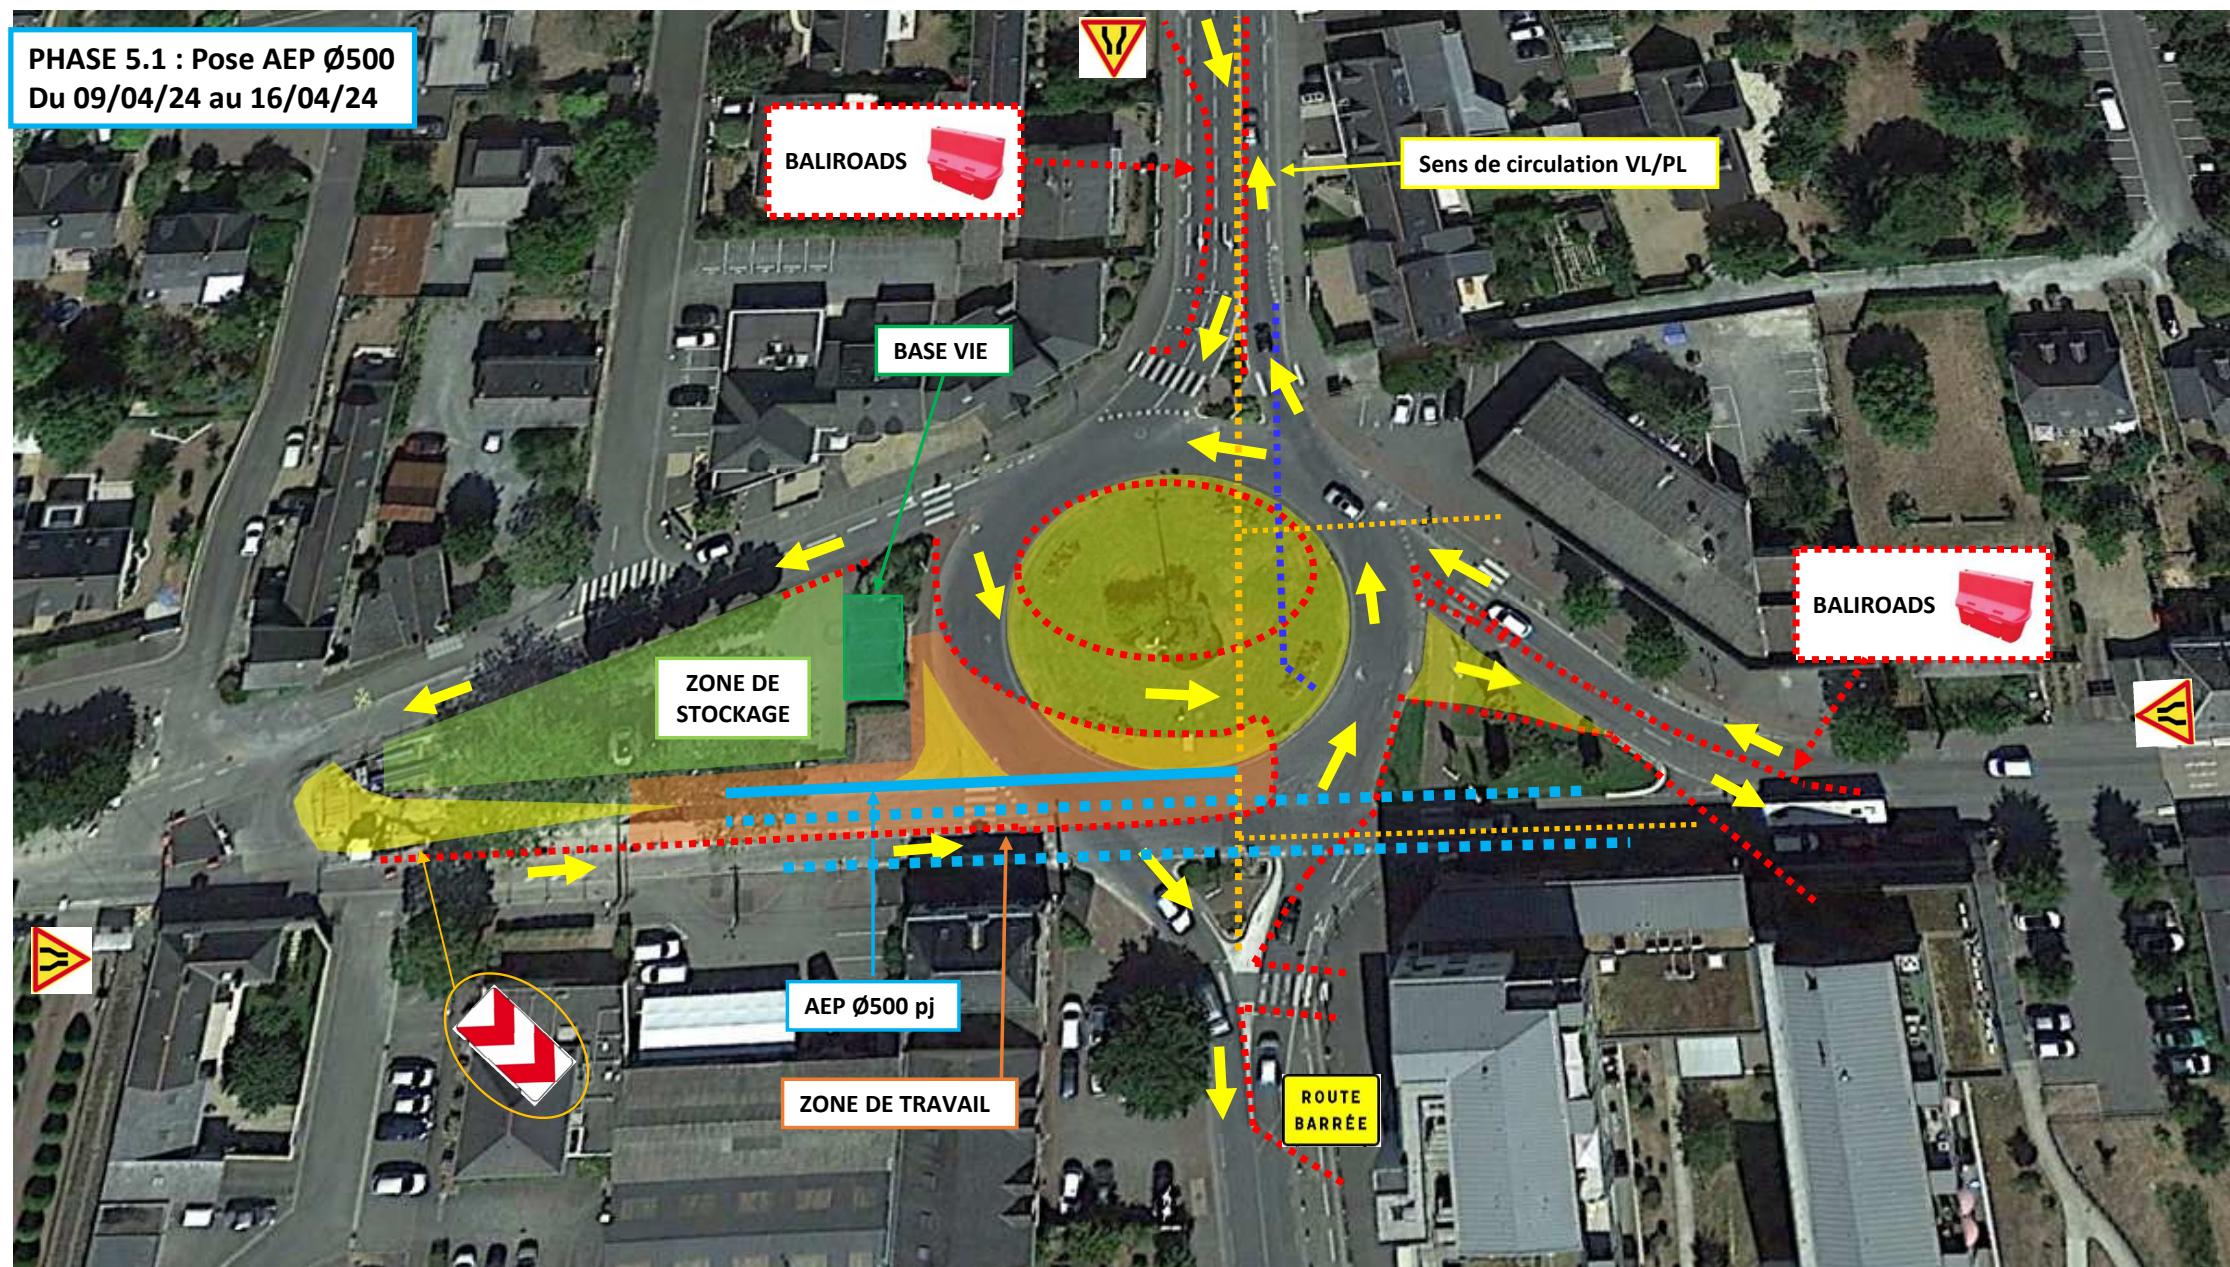


PHASE 5.2 : Pose AEP Ø500

Du 17/04/24 au 23/04/24

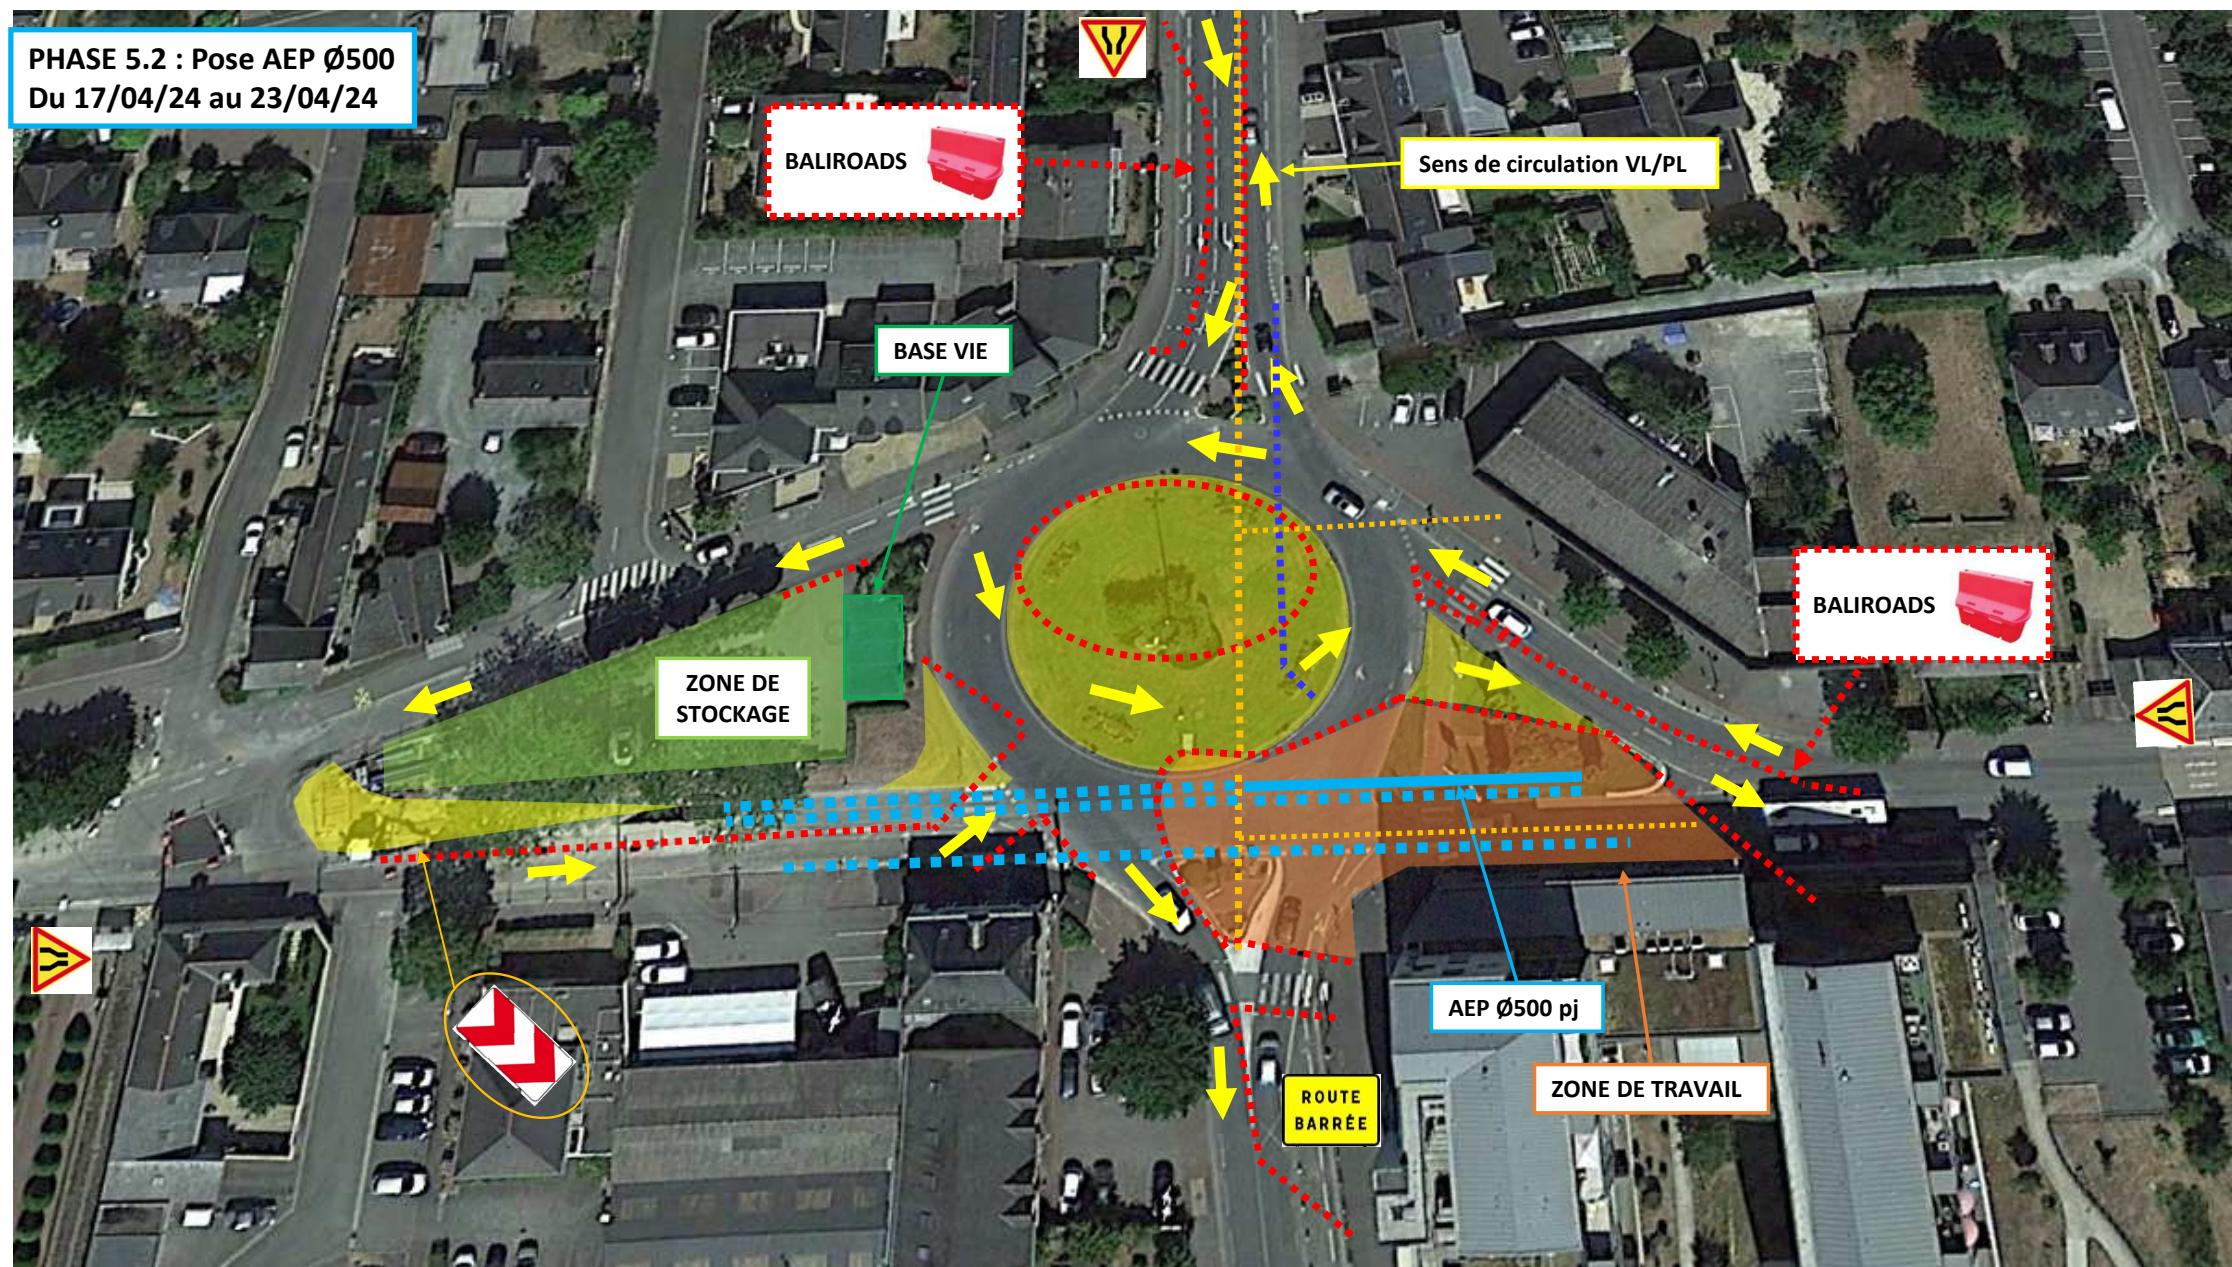

PHASE 5.3 : Essais / Raccordements AEP Ø500
Du 24/04/24 au 07/05/24

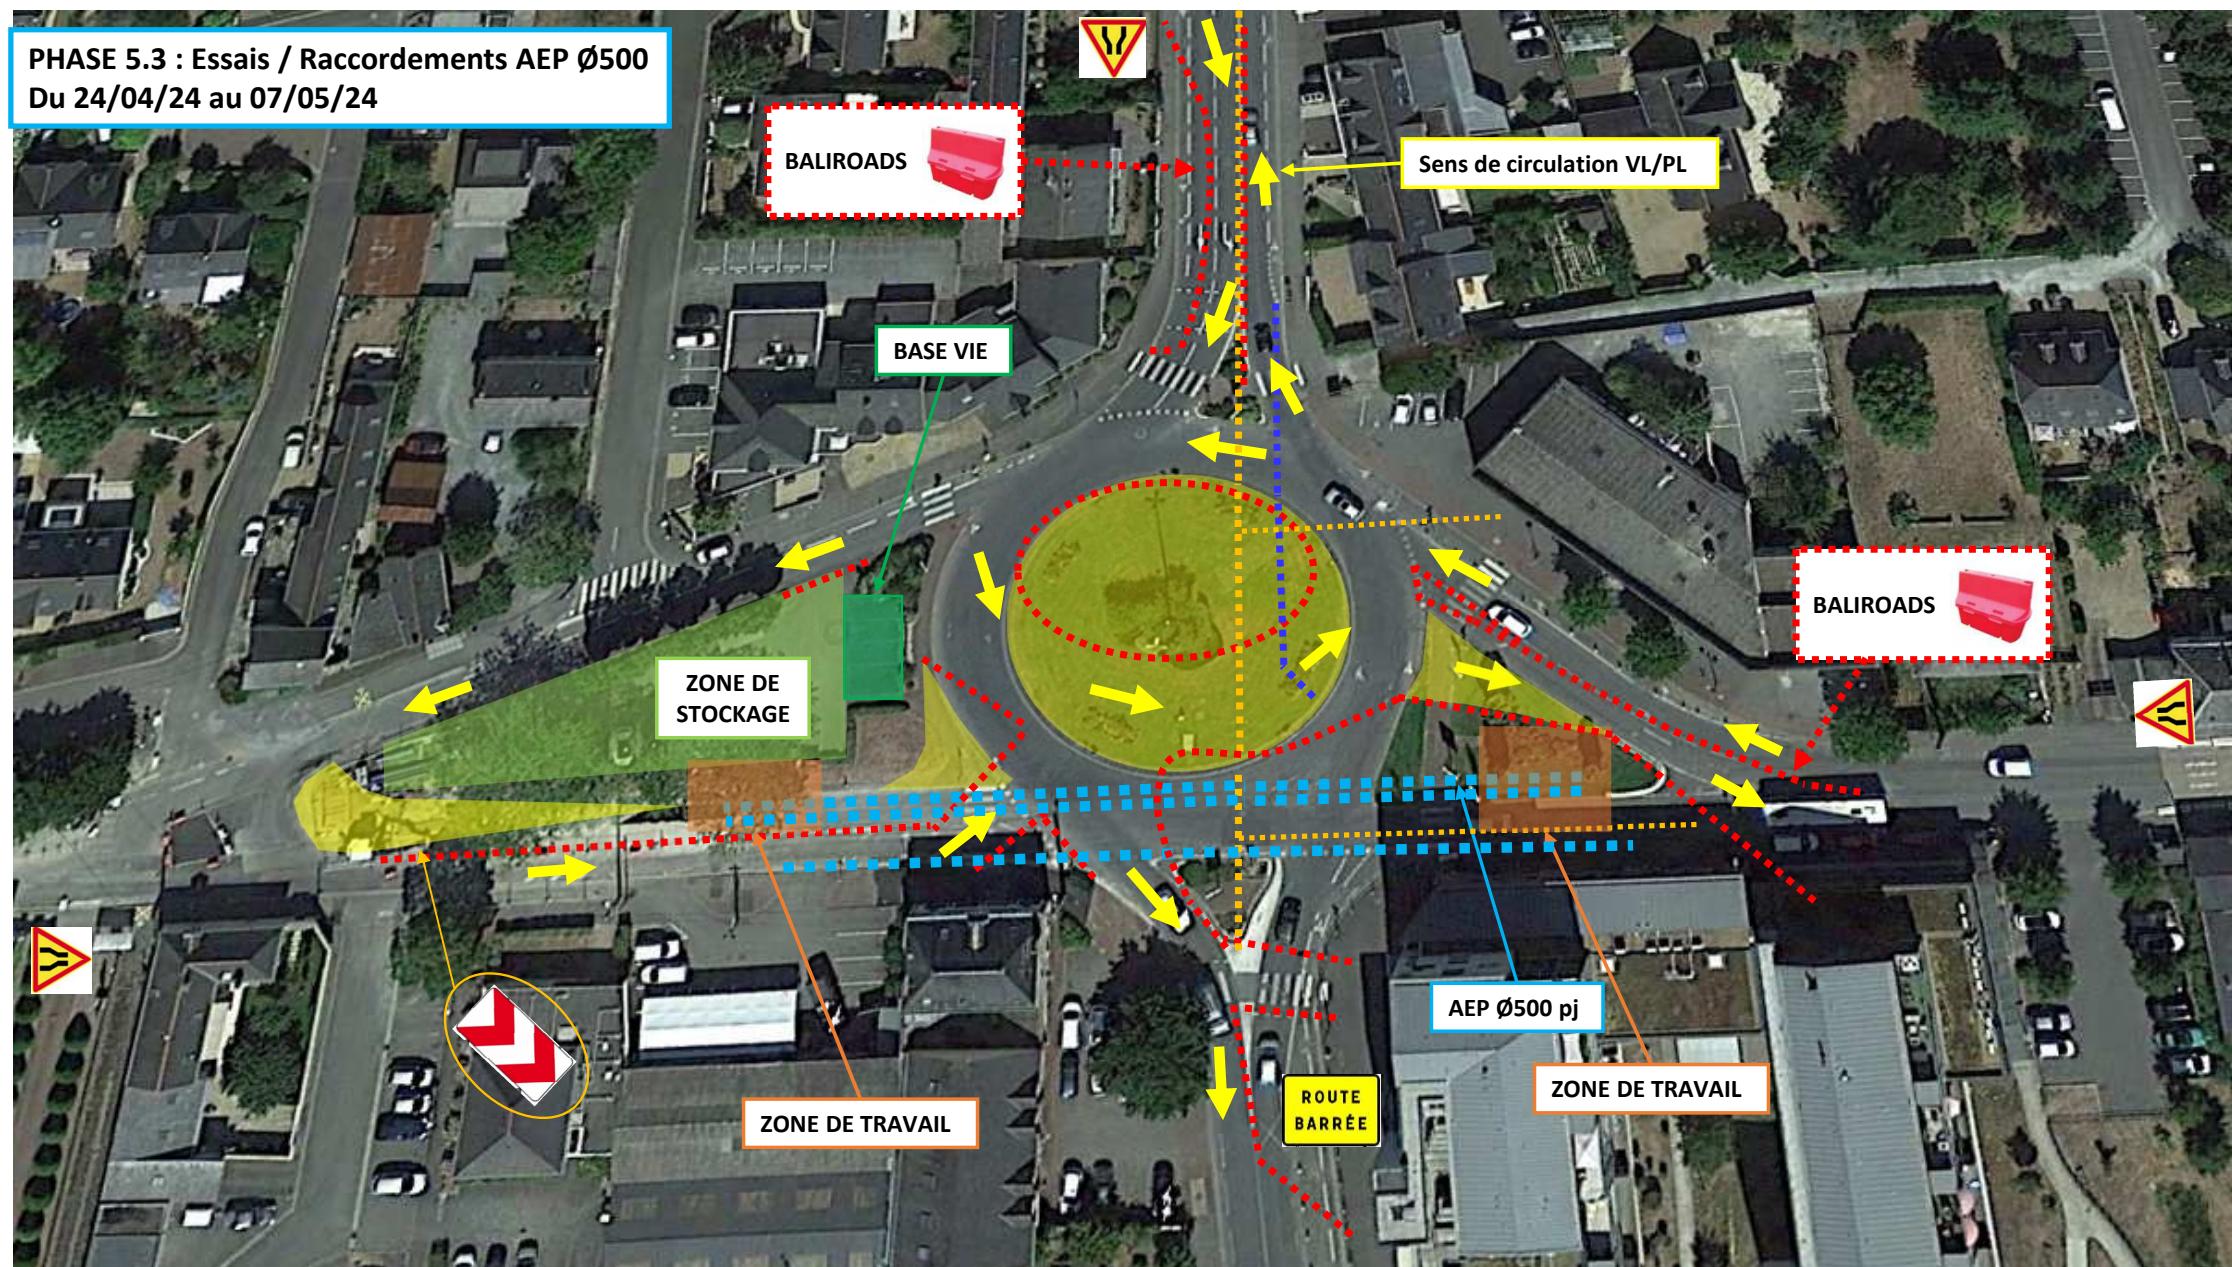

PHASE 6 : Raccordements Bypass &
pose AEP Ø200 + AEP Ø150
Du 13/05/24 au 12/06/24

